DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PROSEDUR.....2

A. Latar Belakang.....2

B. Tujuan.....2

C. Ruang Lingkup.....3

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT.....3

A. Dasar Hukum.....3

B. Dokumen Terkait.....3

III. DEFINISI.....4

IV. KEBIJAKAN.....5

V. FUNGSI DAN ORGANISASI.....5

VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO.....6

VII. TAHAP PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG.....10

A. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG CAPEX.....10

VIII. TAHAP PENYERAHAN DAN PENERIMAAN JASA.....12

A. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI.....12

B. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI UNTUK DIOPERASIKAN OLEH FUNGSI PEMINTA (“Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan”).....15

C. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MASA PEMBERITAHUAN CACAT.....16

D. PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KEPADA FUNGSI PEMINTA.....18

E. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA.....19

IX. PENGECUALIAN /KETENTUAN LAIN-LAIN.....20

X. KRITERIA KEBERHASILAN.....20

XI. *RECORD/FORM* TERKAIT.....20

Nota Penolakan Barang.....21

BAST Barang.....22

BAST Jasa.....23

BAST Pekerjaan Jasa Konstruksi.....24

Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan.....25

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PROSEDUR

A. Latar Belakang

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah membuat "Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa" ("**Pedoman**") yang memuat pokok-pokok ketentuan dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup.

2. Pedoman mengatur bahwa proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari 6 (enam) tahapan proses sebagai berikut
   (1) tahap permintaan Pemilihan Penyedia;
   (2) tahap persiapan Pemilihan Penyedia;
   (3) tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
   (4) tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak;
   (5) tahap pelaksanaan Kontrak; dan
   (6) tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

3. Dalam setiap tahapan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut di atas terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh fungsi terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pada setiap tahap Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

4. Prosedur ini berjudul "Prosedur Penyerahan Dan Penerimaan Barang atau Jasa" ("**Prosedur**") yang khusus mengatur mengenai kegiatan-kegiatan dalam tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

5. Prosedur untuk tahap lainnya diatur tersendiri.

B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya Prosedur ini adalah agar seluruh pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup dapat memahami bagaimana Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa harus dilakukan sehingga proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup dilakukan sesuai tujuan dengan memperhatikan tujuan, prinsip, kebijakan dan etika, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)*, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*) dan nilai budaya AKHLAK.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

C. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Semen Indonesia Grup khususnya dalam tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa, yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan dan/atau AP Semen, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana Perseroan untuk pelaksanaan subsidi/kompensasi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman dari pemerintah.

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

B. Dokumen Terkait

Berikut adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan Prosedur ini pada saat disusun

1. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor M/SIG/PRO/001;
2. Prosedur Permintaan Pemilihan Penyedia;
3. Prosedur Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
4. Prosedur Penandatangan dan Pelaksanaan Kontrak; dan
5. Prosedur Manajemen K3 untuk Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

III. DEFINISI

Seluruh definisi yang diatur dalam Pedoman juga berlaku dalam Prosedur ini. Dalam Prosedur ini yang dimaksud dengan

1. **Barang Capex Konstruksi** adalah Barang Capex yang merupakan Hasil Jasa Pekerjaan Konstruksi.

2. **BAST Barang** adalah BAST untuk serah terima Barang.

3. **BAST Jasa** adalah BAST untuk serah terima Jasa.

4. **Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi** adalah produk pemberian Jasa Konsultansi oleh Penyedia yang berbentuk antara lain dokumen-dokumen tertulis yang memuat pendapat/advis, laporan dan hal lainnya beserta Laporan Hasil Pekerjaan.

5. **Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi** adalah produk pemberian Jasa Pekerjaan Konstruksi oleh Penyedia berupa Barang Capex Konstruksi.

6. **Kriteria Penerimaan** adalah kriteria penerimaan hasil Pengujian Akhir yang dibuat oleh Penyedia sesuai dengan Kontrak Konstruksi dan disetujui oleh Project Manager.

7. **Laporan Hasil Pekerjaan** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Fungsi Pelaksana yang menjelaskan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi atau Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya.

8. **Masa Pemberitahuan Cacat** adalah waktu yang ditentukan dalam Kontrak Konstruksi, untuk memberitahukan kepada Penyedia mengenai cacat atau kerusakan Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi atau bagiannya.

9. **Nota Penolakan Barang** adalah surat yang diterbitkan oleh Fungsi Pelaksana yang menyatakan menolak Barang dari Penyedia.

10. **Pengujian Akhir** adalah pengujian yang dilakukan oleh Penyedia setelah terpenuhinya seluruh syarat *Mechanical Completion*.

11. **Prosedur Pengujian Akhir** adalah dokumen untuk Pengujian Akhir sesuai dengan Kontrak Konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh Project Manager.

12. **Uang Retensi** adalah akumulasi uang yang ditahan oleh Fungsi Peminta dan dibayarkan setelah berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

IV. KEBIJAKAN

Kebijakan untuk Prosedur Penyerahan dan Penerimaan Barang atau Jasa merujuk pada ketentuan yang berlaku di Pedoman.

V. FUNGSI DAN ORGANISASI

Fungsi dan organisasi pada Prosedur Penyerahan dan Penerimaan Barang atau Jasa merujuk pada Bab VIII. Pelaku Pengadaan dalam Pedoman.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

Risiko dan pengendalian risiko pada tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa adalah sebagai berikut:

KODE	PROSES/AKTIVITAS	NAMA RISIKO
R1	Penyerahan dan penerimaan barang	Kuantitas barang tidak sesuai
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Kuantitas barang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.	1. Membuat daftar kriteria penerimaan barang berdasarkan Kontrak 2. Melakukan pemeriksaan kualitas dan teknis terhadap barang yang disuplai saat kedatangan 3. Meminta bantuan fungsi terkait atau menunjuk pihak ketiga untuk memastikan kesesuaian antara syarat syarat dan ketentuan dalam kontrak dengan Barang yang akan diserahkan 4. Pembuatan laporan penolakan barang atas kuantitas barang yang tidak sesuai
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R2	Penyerahan dan penerimaan barang	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Kualitas barang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati	1. Membuat daftar kriteria penerimaan barang berdasarkan Kontrak 2. Melakukan pemeriksaan kualitas dan teknis terhadap barang yang disuplai saat kedatangan 3. Meminta bantuan fungsi terkait atau menunjuk pihak ketiga untuk memastikan kesesuaian antara syarat syarat dan ketentuan dalam kontrak dengan Barang yang akan diserahkan. 4. Pembuatan laporan penolakan barang atas kualitas barang yang tidak sesuai

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R3	Penyerahan dan penerimaan barang	Dokumen penyerahan dan penerimaan tidak valid
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Dokumen penyerahan dan penerimaan tidak valid	1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan substansi dokumen pengiriman 2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung penerimaan sesuai kontrak 3. Tidak melakukan penerimaan barang jika dokumen tidak sesuai
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R4	Penyerahan dan penerimaan barang	Nota Penolakan Barang
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Nota penolakan barang tidak dibuat ketika terjadi penolakan	1. Sosialisasi prosedur 2. Melakukan update monitoring CAPEX
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R5	Penyerahan dan penerimaan barang	Tidak ada tindak lanjut oleh penyedia terhadap barang yang dibuat nota penolakan
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Barang yang ditolak tidak dilakukan penanganan oleh penyedia	1. Di dalam nota penolakan, pelaksana mencantumkan batas waktu perbaikan atau penggantian oleh penyedia terkait barang yang ditolak 2. Pelaksana melakukan kembali pemeriksaan dan verifikasi terhadap barang yang oleh penyedia dinyatakan telah selesai diperbaiki atau diganti. 3. Melakukan kembali mitigasi resiko R1 dan R2 saat melakukan verifikasi barang

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

KODE	PROSES/AKTIVITAS	NAMA RISIKO
R6	Penyerahan dan penerimaan Jasa	Jasa konstruksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Jasa yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria penerimaan yang ditentukan dalam Kontrak konstruksi	1. Melaksanakan pengujian akhir dan *mechanical completion* terhadap pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan. 2. Melakukan penolakan terhadap penyedia untuk melakukan *mechanical completion* jika syarat untuk melaksanakannya tidak lengkap. 3. Memastikan pengujian akhir dari penyedia telah sesuai dengan kriteria penerimaan untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Pengujian Akhir. 4. Berita Acara Pengujian Akhir oleh penyedia dipastikan sesuai kriteria untuk selanjutnya dilakukan approval oleh Project Manager
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R7	Penyerahan dan penerimaan Jasa	Dokumen jasa konstruksi yang diserahkan ke peminta tidak valid
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Dokumen jasa konstruksi yang diserahkan ke peminta tidak valid	1. Memastikan terdapat dokumen Berita Acara Pengujian Akhir yang di-*approve* oleh Project Manager 2. Memastikan telah diterima seluruh dokumen terkait pekerjaan jasa konstruksi dalam Dokumen As Built yang disyaratkan dalam Kontrak konstruksi 3. Memastikan terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pelaksanaan serah terima operasi yang telah ditandatangani oleh Project Manager 4. Memastikan peminta menerima Dokumen As Built dari Project Manager saat penyerahan pekerjaan jasa konstruksi
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R8	Penyerahan dan penerimaan	Kuantitas dan kualitas Jasa Konsultansi

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

	pekerjaan Jasa Konsultansi	tidak sesuai
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Kuantitas dan kualitas Jasa Konsultansi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak	1. Memastikan kuantitas dan kualitas Jasa Konsultansi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 2. Memastikan dilakukan langkah langkah konsekuensi ketika kualitas dan kuantitas Jasa Konsultansi dan jasa lainnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak 3. Memastikan tidak dilakukan approval BAST Jasa oleh pelaksana ketika kualitas dan kuantitas Jasa Konsultansi dan jasa lainnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R9	Penyerahan dan penerimaan pekerjaan jasa konsultasi	Dokumen penyerahan dan penerimaan jasa konsultasi tidak lengkap
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Dokumen penyerahan dan penerimaan jasa konsultasi tidak lengkap	1. Memastikan bahwa hasil Jasa Konsultansi sudah sesuai dengan Kontrak 2. Memastikan bahwa dokumen BAST Jasa dibuat 2 rangkap dan bermeterai serta ditandatangani oleh Fungsi Pelaksana dan Fungsi Penyedia sesuai batas kewenangan

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:


VII. TAHAP PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG

Penyerahan dan penerimaan Barang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak.

Fungsi Pelaksana harus membuat daftar kriteria penerimaan Barang berdasarkan Kontrak, yang disepakati para pihak dalam Kontrak, yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak penyerahan Barang dari Penyedia.

Kegiatan pada tahap penyerahan dan penerimaan Barang terdiri atas kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang Capex.

A. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG CAPEX

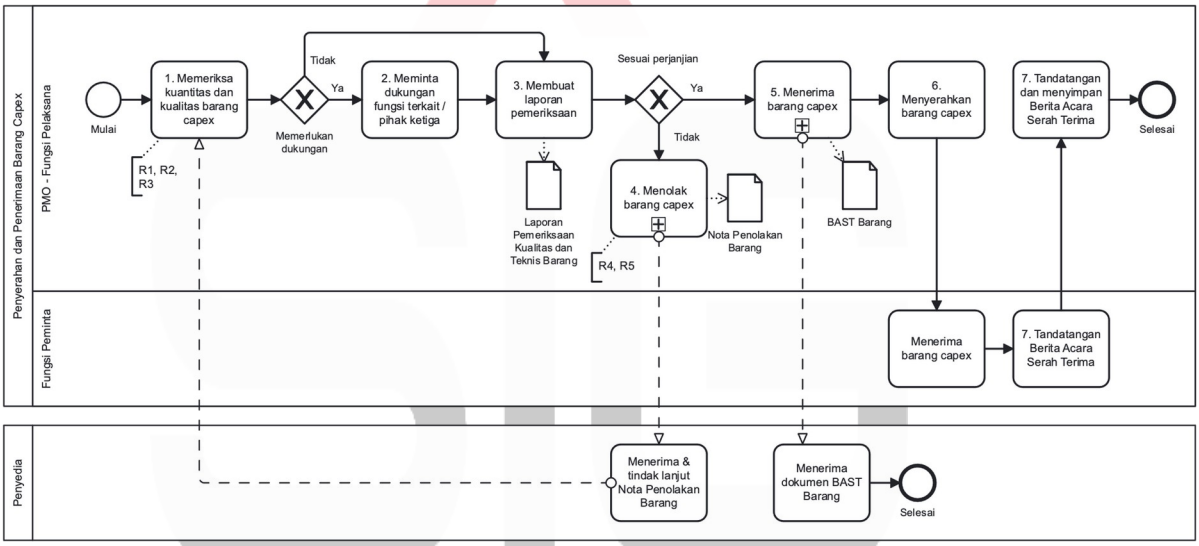

Kegiatan Fungsi Pelaksana, antara lain memeriksa kuantitas dan kualitas Barang Capex, dengan ketentuan:

1. kuantitas dan kualitas Barang Capex harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak;

2. dalam melakukan pemeriksaan kualitas dan teknis, Fungsi Pelaksana dapat meminta bantuan fungsi terkait atau menunjuk pihak ketiga untuk memastikan kesesuaian antara syarat-syarat dan ketentuan dalam Kontrak dan Barang yang akan diserahkan;

3. Fungsi Pelaksana membuat laporan pemeriksaan kualitas dan teknis Barang Capex;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

4. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas Barang Capex tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak maka Fungsi Pelaksana **menolak** Barang Capex tersebut dengan menerbitkan **Nota Penolakan Barang**, dengan ketentuan:

   (1) mengikuti Format Nota Penolakan Barang yang tercantum dalam Bab XI Prosedur ini;
   (2) asli Nota Penolakan Barang diserahkan kepada Penyedia dan salinannya disimpan oleh Fungsi Pelaksana;
   (3) harus menyebutkan informasi mengenai penolakannya, antara lain: (i) apakah penolakan hanya untuk sebagian atau seluruh Barang Capex; (ii) alasan penolakan; (iii) tindak lanjut yang harus dilakukan Penyedia; dan (iv) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Fungsi Pelaksana;
   (4) jika tindak lanjut yang harus dilakukan Penyedia adalah memperbaiki Barang Capex, maka Fungsi Pelaksana harus
      (i) menentukan kapan perbaikan tersebut harus selesai dilakukan Penyedia dan kapan harus diserahkan kepada Fungsi Pelaksana;
      (ii) setelah Barang Capex sudah diperbaiki dan diserahkan kepada Fungsi Pelaksana maka Fungsi Pelaksana kembali melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas;
      (iii) jika berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas kuantitas dan kualitas, Barang Capex masih belum memenuhi syarat dan ketentuan penyerahan dan penerimaan yang disepakati dalam Kontrak, Fungsi Pelaksana menolak lagi dengan menerbitkan Nota Penolakan Barang Capex yang kedua dan demikian seterusnya jika tetap belum memenuhi, hingga hasil pemeriksaan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Barang Capex yang disepakati dalam Kontrak; dan
      (iv) dalam hal Penyedia menyatakan tidak dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian Barang Capex, Fungsi Pelaksana dapat melakukan pengakhiran Kontrak.

5. jika berdasarkan hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas, Barang Capex telah memenuhi syarat dan ketentuan serah terima yang tercantum dalam Kontrak (daftar kriteria penerimaan) maka Fungsi Pelaksana **menerima** Barang Capex tersebut dengan membuat, menyetujui dan menandatangani **BAST Barang**, dengan ketentuan:

   (1) mengikuti Format BAST Barang yang tercantum dalam Bab XI Prosedur ini;
   (2) mencantumkan jenis dan jumlah Barang Capex yang diserahterimakan, serta keterangan lain sebagaimana diperlukan;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:


(3) pembuatan, persetujuan dan penandatanganan BAST Barang harus sesuai dengan ketentuan mengenai Batas Kewenangan persetujuan BAST untuk Barang Capex sebagaimana diatur dalam Pedoman;
(4) harus ditandatangani oleh wakil Penyedia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia; dan
(5) dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) asli diserahkan kepada Penyedia dan 1 (satu) asli disimpan oleh Fungsi Pelaksana.

6. Fungsi Pelaksana menyerahkan kepada Fungsi Peminta barang yang telah diterima dari Penyedia setelah seluruh ketentuan dalam Kontrak diselesaikan.
7. Fungsi Pelaksana dan Fungsi Peminta membuat dan menandatangani berita acara serah terima. Fungsi Pelaksana menyimpan berita acara serah terima tersebut.

VIII. TAHAP PENYERAHAN DAN PENERIMAAN JASA

Kegiatan pada tahap penyerahan dan penerimaan Jasa dibedakan atas kegiatan penyerahan dan penerimaan: (i) Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi; (ii) Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi; dan (iii) Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya.

A. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

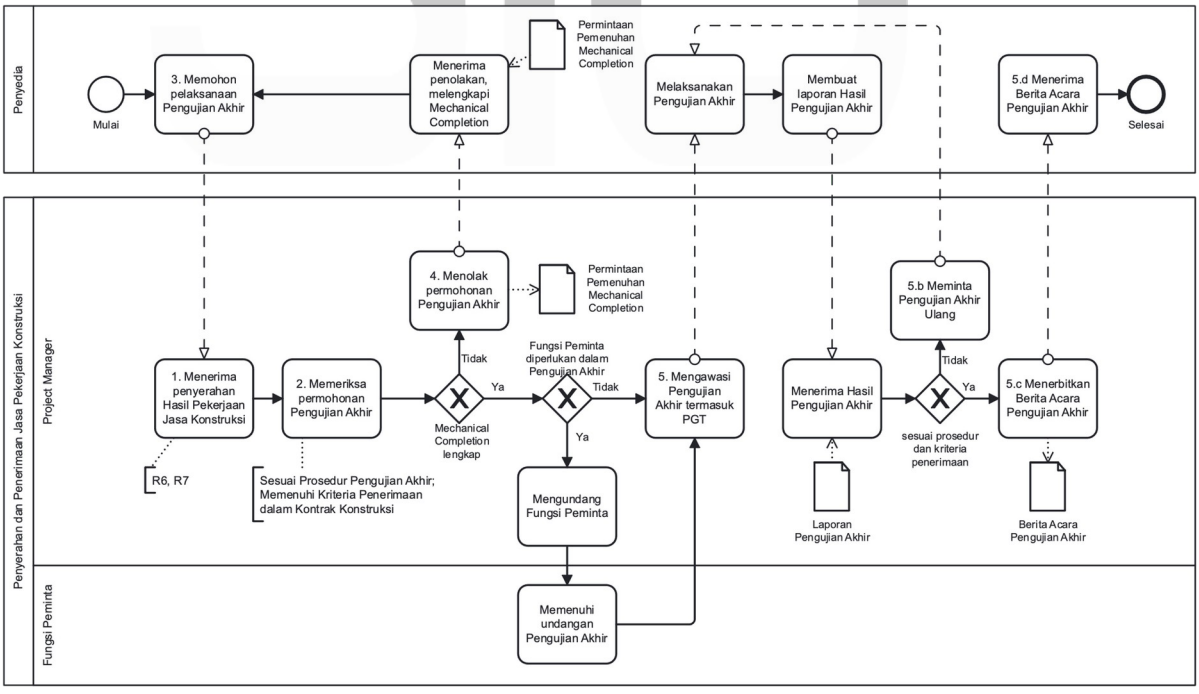

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

1. Project Manager menerima penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia.

2. Project Manager menerima Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah hasil Pengujian Akhir sesuai dengan Prosedur Pengujian Akhir dan telah berhasil memenuhi Kriteria Penerimaan yang ditentukan dalam Kontrak Konstruksi.

3. Jika tidak diatur lain dalam Kontrak Konstruksi, Pengujian Akhir hanya dapat dilakukan setelah Project Manager menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penyedia mengenai kesiapan untuk melaksanakan setiap Pengujian Akhir, dan selesainya *Mechanical Completion*.

   Mechanical Completion adalah penyelesaian pekerjaan fisik yang menjadi bagian dari konstruksi sipil, mekanikal, elektrik/kelistrikan, instrumentasi, proses lainnya yang ditentukan dalam Kontrak dan seluruh peralatan yang dibangun untuk diuji secara individu/sub-sistem, termasuk penyelesaian *training* operasi dan pemeliharaan, penyerahan kepada Project Manager suatu dokumen/*dosier* yang sesuai dengan gambar-gambar, spesifikasi, instruksi, dan *code and standard* yang berlaku untuk memenuhi kriteria berikut:

   a. seluruh peralatan mekanis atau setiap bagiannya, telah dipasang, disejajarkan, dan dilumasi (jika diperlukan);
   b. seluruh peralatan listrik atau bagiannya, telah dipasang dan disambungkan ke panel listrik dan atau otomasi yang benar;
   c. seluruh peralatan telah siap diuji untuk dijalankan secara individual dari panel lokal dan atau melalui ruang kendali pusat.

4. Project Manager dapat menolak permintaan Penyedia untuk melakukan Pengujian Akhir apabila Penyedia belum dapat memenuhi persyaratan *Mechanical Completion*, dan meminta secara tertulis kepada Penyedia untuk memenuhinya.

5. Pengujian Akhir, termasuk pengujian performa *(Performance Guarantee Test "***PGT***")* dilakukan oleh Penyedia diawasi oleh Project Manager. Dalam mengawasi Pengujian Akhir, Project Manager dapat melibatkan Fungsi Peminta.

   Untuk keperluan Pengujian Akhir, Project Manager harus memperhatikan hal-hal berikut:

   a. sebelum dilakukan Pengujian Akhir, Project Manager harus memastikan telah menerima seluruh dokumen yang diperlukan untuk Pengujian Akhir yang disyaratkan dalam Kontrak Konstruksi. Jika dokumen Pengujian Akhir belum lengkap dan benar, Project Manager

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

harus meminta secara tertulis kepada Penyedia. Pengujian Akhir dilarang dimulai sebelum Project Manajer menerima dokumen yang diperlukan untuk Pengujian Akhir dan terpenuhinya persyaratan *Mechanical Completion*;

b. pengujian Akhir harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Pengujian Akhir dan hasilnya harus memenuhi Kriteria Penerimaan. Jika hasil Pengujian Akhir belum sesuai dengan Kriteria Penerimaan, Project Manager meminta Penyedia mengulangi Pengujian Akhir hingga memperoleh hasil Pengujian Akhir yang sesuai dengan Kriteria Penerimaan;

c. Project Manager menerima Laporan Hasil Pengujian Akhir dari Penyedia jika hasil Pengujian Akhir telah memenuhi Kriteria Penerimaan, dan berdasakan laporan tersebut, Project Manager menerbitkan **Berita Acara Pengujian Akhir**;

d. pengujian Akhir dianggap selesai apabila Penyedia telah menerima Berita Acara Pengujian Akhir dari Project Manager.

6. Memastikan kondisi K3 dalam kondisi aman dengan melakukan:

b. Inspeksi pada tempat kerja dan memastikan semua peralatan dan material sisa telah dibersihkan atau diamankan;


c. Garis pembatas dan kebersihan tempat kerja telah dikembalikan pada kondisi semula;

d. Peralatan safety telah tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI UNTUK DIOPERASIKAN OLEH FUNGSI PEMINTA ("Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan")

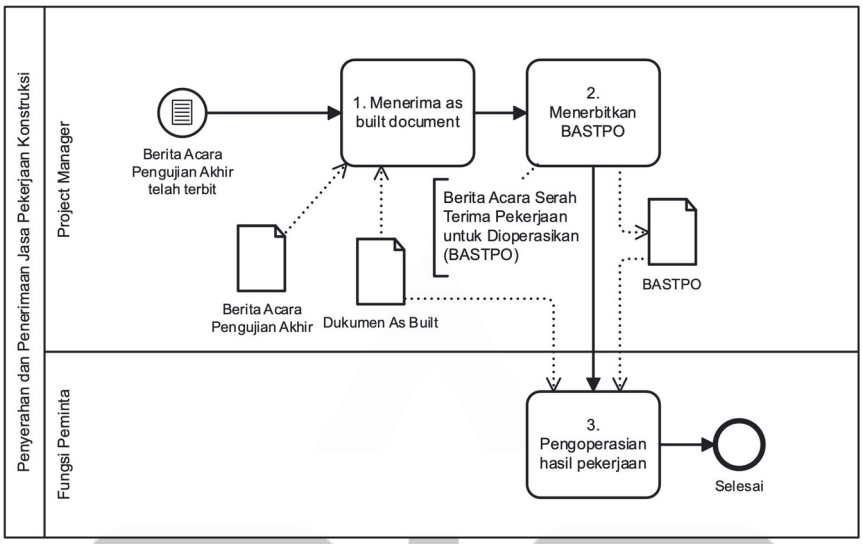

1. Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan dilakukan setelah Project Manager (i) menerbitkan Berita Acara Pengujian Akhir; (ii) menerima *maintenance* dan *operation manual*; dan (iii) menerima seluruh dokumen terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi dalam bentuk *as built document,* yang disyaratkan dalam Kontrak Konstruksi ("**Dokumen As Built**").


2. Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan ditandai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan oleh Project Manager, mengikuti format yang tercantum dalam Bab XI Prosedur ini.

3. Setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Untuk Dioperasikan, Project Manager menyerahkan Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi beserta Dokumen As Built kepada Fungsi Peminta untuk dioperasikan oleh Fungsi Peminta.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

B. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MASA PEMBERITAHUAN CACAT

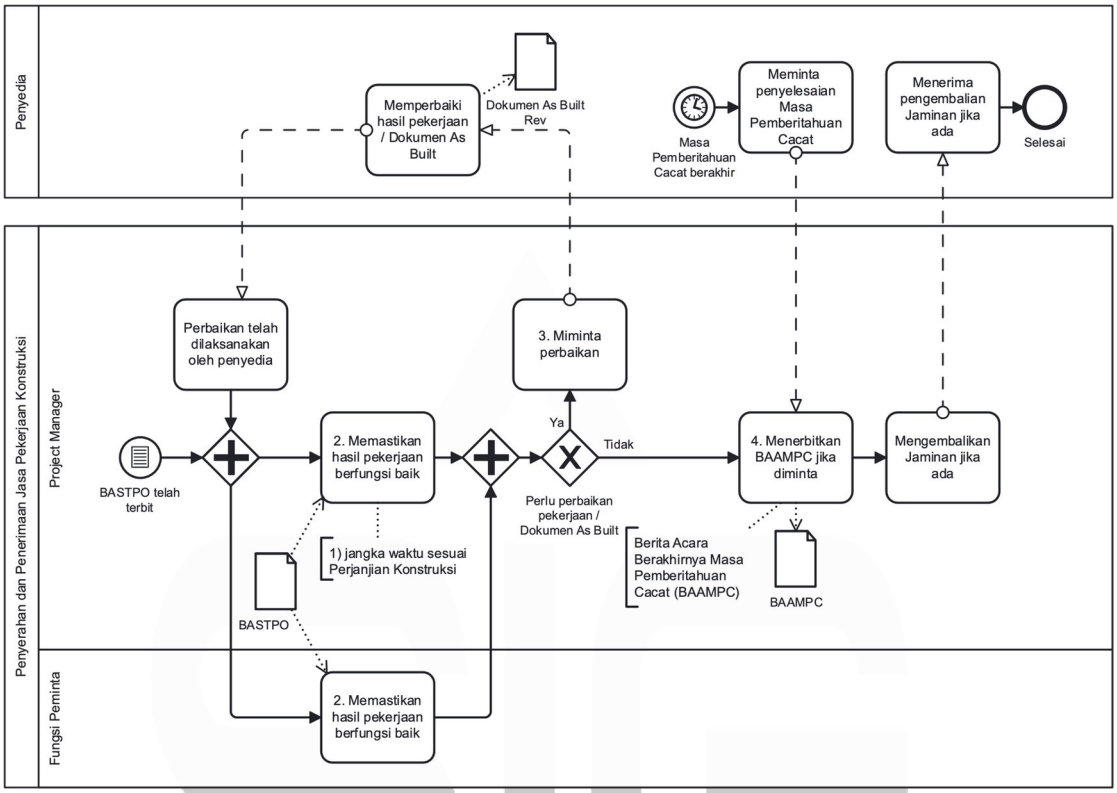

1. Masa Pemberitahuan Cacat berlaku sejak tanggal BAST Pekerjaan Jasa Konstruksi sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Konstruksi.

2. Selama Masa Pemberitahuan Cacat, Project Manager harus berkoordinasi dengan Fungsi Peminta untuk memastikan hasil pekerjaan jasa konstruksi tidak rusak dan berfungsi dengan baik. Jika terdapat kerusakan atau cacat selama Masa Pemberitahuan Cacat, Project Manager harus segera memberitahukan kepada Penyedia untuk memperbaiki, sesuai dengan ketentuan Kontrak Konstruksi.

3. Setelah berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat dan tidak ada kerusakan atau seluruh kerusakan selama Masa Pemberitahuan Cacat telah selesai diperbaiki, maka Project Manager harus memastikan bahwa Dokumen As Built telah lengkap dan benar sesuai yang terpasang/terbangun, dan telah diperbaiki selama Masa Perbaikan Cacat, jika ada perbaikan. Project Manager harus meminta Penyedia untuk melengkapi atau memperbaiki jika ditemukan ketidaksesuaian, hingga isi Dokumen As Built sesuai dengan Kontrak Konstruksi dan aktual terpasang/terbangun.

Catatan Dari:


Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

4. Selanjutnya Project Manager, atas permintaan Penyedia menandatangani dan menyerahkan kepada Penyedia, suatu berita acara yang menyatakan berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat. Berdasarkan berita acara tersebut, Project Manager mengembalikan seluruh jaminan untuk perbaikan, jika ada, baik yang berupa bank garansi, Uang Retensi, atau bentuk lainnya, kepada Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

C. PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KEPADA FUNGSI PEMINTA

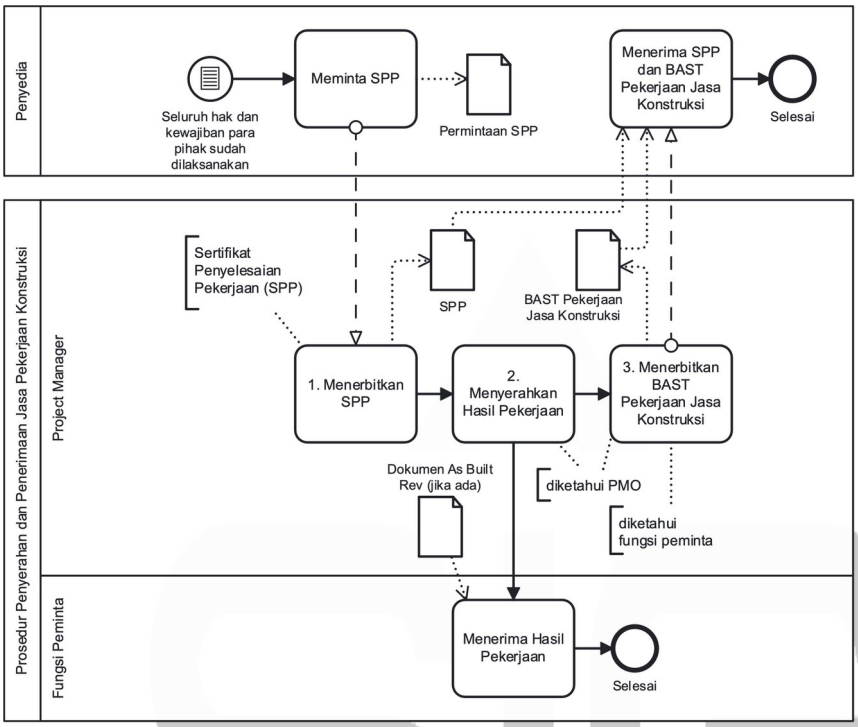

1. Setelah seluruh hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak Konstruksi selesai dilaksanakan, Project Manager, atas permintaan tertulis Penyedia, menerbitkan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan, mengikuti format yang tercantum dalam Bab XI Prosedur ini.


2. Berdasarkan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan, Project Manager diketahui oleh Fungsi Pelaksana, menyerahkan seluruh Hasil Pekerjaan Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Fungsi Peminta, dilampiri dengan Dokumen As Built yang telah diperbaiki selama Masa Pemberitahuan Cacat, jika ada.

3. Penyediaan Jasa Pekerjaan Konstruksi dianggap selesai setelah Project Manager diketahui oleh Fungsi Pelaksana dan Fungsi Peminta telah menandatangani BAST Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan telah diterbitkan oleh Project Manager kepada Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

C. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA

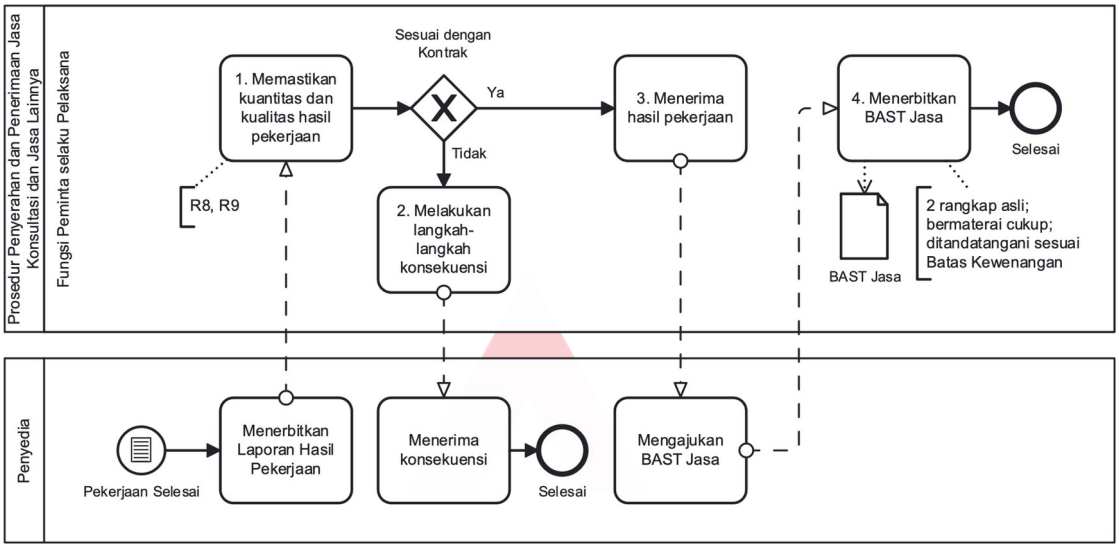

Kegiatan penyerahan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dilakukan oleh Penyedia dan penerimaannya dilakukan oleh Fungsi Peminta selaku Fungsi Pelaksana setelah Fungsi Pelaksana menerima dari Penyedia suatu laporan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Fungsi Peminta selaku Fungsi Pelaksana memeriksa kuantitas dan kualitas Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, dengan ketentuan:

1. kuantitas dan kualitas Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan dilakukan selama jangka waktu pemberian Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya yang diatur dalam Kontrak;

2. jika berdasarkan pemeriksaan kuantitas dan kualitas, Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya tidak sesuai syarat dan ketentuan dalam Kontrak, maka Fungsi Pelaksana melakukan langkah-langkah yang diatur dalam Kontrak mengenai konsekuensi bagi Penyedia jika hasil pekerjaan konsultansi dan Jasa Lainnya tidak sesuai dengan Kontrak;

3. jika Laporan Hasil Pekerjaan diterima oleh Fungsi Pelaksana, Penyedia mengajukan BAST Jasa kepada Fungsi Pelaksana untuk disetujui;

4. BAST Jasa mengikuti format yang tercantum dalam Bab XI Prosedur ini. BAST Jasa dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh Penyedia yang diwakili oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia dan Fungsi Pelaksana yang

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Batas Kewenangan persetujuan BAST untuk Jasa Opex sebagaimana diatur dalam Pedoman.

IX. PENGECUALIAN /KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sebagian atau seluruh ketentuan dalam Prosedur ini tidak dapat dilaksanakan, maka untuk menjaga kelancaraan operasional Semen Indonesia Grup, Fungsi Pelaksana dapat meminta persetujuan kepada Direktur Operasi atau Direktur lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama Perseroan.

2. Fungsi Pelaksana wajib menyimpan seluruh dokumen penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyerahan dan Penerimaan Barang Opex, Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya, akan diatur lebih lanjut dalam prosedur yang akan ditetapkan kemudian.

4. Kontrak yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Prosedur ini dalam pelaksanaan penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa merujuk Prosedur ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Kontrak.

X. KRITERIA KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa adalah jika

1. seluruh pelaku Pengadaan di lingkungan Semen Indonesia Grup dapat memahami bagaimana Pengadaan dalam tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa harus dilaksanakan;
2. tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Barang dan/atau Jasa diterima sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

XI. *RECORD/FORM* TERKAIT

1. Nota Penolakan Barang.
2. BAST Barang.
3. BAST Jasa.
4. BAST Pekerjaan Jasa Konstruksi.
5. Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

LAMPIRAN I

Nota Penolakan Barang

Tanggal :

PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

NOTA PENOLAKAN BARANG

Halaman :

Kepada Yth :

Nomor :
Del. Date :

Dengan Hormat :

Item	Jumlah	Satuan	Deskripsi Material

Alasan Penolakan:

Perhatian : Nota Penolakan ini harap dijawab dan barang tersebut segera diambil kembali selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari setelah tanggal surat ini. Bila lewat dari tanggal tersebut, akan diberlakukan syarat-syarat umum pembelian dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(Diisi nama pejabat)
(Diisi nama jabatan)

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

LAMPIRAN II

BAST Barang

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
NPWP : 01.001.631.9-051.000

Jakarta : GEDUNG SOUTH QUARTER TOWER A
LANTAI 19 – 20, CILANDAK BARAT
CILANDAK, JAKARTA SELATAN
DKI JAKARTA 12430

NAMA PEMASOK :
Disikan Nama penyedia

Kode : Disikan Kode Penyedia

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Halaman: 1

NO. :
TGL. :
DOC. DATE :
KODE ANGGARAN :
Delivery Note :
Bill of landing :

NOMOR OP :
TANGGAL OP :
TGL. BATAS OP :
NOMOR INVOICE :
NILAI OP :
UK PEMINTA :

No. Item	Nomor Stock	Sat.	Jumlah Barang	Nama Barang	Harga Satuan (IDR)	Jumlah Harga (IDR)
1						

Keterangan:

Dengan Huruf | Rp.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Yang Menerima

(Ditulis nama pejabat yang berwenang)
(Ditulis nama jabatan)

(Diisi nama penyedia)
Yang Menyerahkan

(Ditulis nama pejabat yang berwenang)
(Ditulis nama jabatan

LAMPIRAN III

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

BAST Jasa

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA
Nomor: (*diisi nomor BAST Jasa*)

Pada hari ini *(diisikan hari, tanggal bulan dan tahun)*, berita acara ini dibuat dan disepakati oleh dan antara :

1 Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

2 Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : *(Diisi nama penyedia)*
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

Dengan berdasarkan

Kontrak nomor *(diisikan nomor Kontrak)* perihal *(diisikan nama pekerjaannya)*

Kedua belah pihak secara bersama - sama sepakat bahwa :

a). PIHAK KEDUA telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU hasil pelaksanaan pekerjaan :

(diisikan nama pekerjaannya)

Nilai tagihan : IDR (diisi dalam angka) (diisi dalam tulisan)

Tidak ada denda

b). PIHAK KESATU menerima dengan baik penyelesaian dan penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dengan huruf a) di atas.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.	*(Diisi nama penyedia)*
Yang Menerima	Yang Menyerahkan
(Ditulis nama pejabat yang berwenang)	*(Ditulis nama pejabat yang berwenang)*
(Ditulis nama jabatan)	*(Ditulis nama jabatan)*


Perhatian: Selanjutnya Berita Acara ini dicetak oleh Penyedia Jasa dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, masing-masing pihak berhak memperoleh 1 (satu) rangkap.

LAMPIRAN IV

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

BAST Pekerjaan Jasa Konstruksi

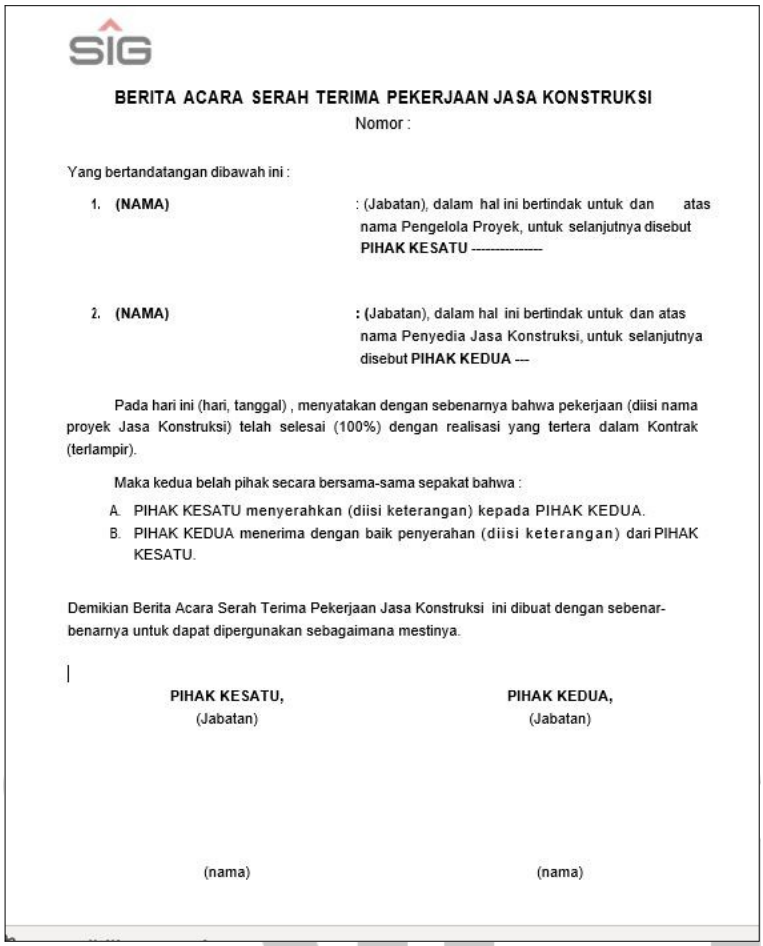

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **(NAMA)** : (Jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Proyek, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ----------

2. **(NAMA)** : (Jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ---

Pada hari ini (hari, tanggal) , menyatakan dengan sebenarnya bahwa pekerjaan (diisi nama proyek Jasa Konstruksi) telah selesai (100%) dengan realisasi yang tertera dalam Kontrak (terlampir).

Maka kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat bahwa :

A. PIHAK KESATU menyerahkan (diisi keterangan) kepada PIHAK KEDUA.
B. PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan (diisi keterangan) dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Konstruksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
(Jabatan)	(Jabatan)
(nama)	(nama)

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

LAMPIRAN V

Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan

SERTIFIKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN

FORMULIR SERTIFIKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor Kontrak : _____

Pemenang Kontrak : _____

Deskripsi Sertifikasi : Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan untuk .....

1. (Keterangan).....
.....
.....
.....

2. (Keterangan).....
.....
.....
.....

(Sertifikat ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan dari kewajiban atau jaminan apapun berdasarkan kontrak atau sebagai pelepasan hak Perusahaan berdasarkan Kontrak.)

(Jabatan Pejabat Berwenang)	(Jabatan Pihak Terkait)
(tandatangan) _____	(tandatangan) _____
Nama _____	Nama _____
Tanggal _____	Tanggal _____

Lampiran:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:
