DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PROSEDUR.....

A. Latar Belakang.....

B. Tujuan.....

C. Ruang Lingkup.....

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT.....

A. Dasar Hukum.....

B. Dokumen Terkait.....

III. DEFINISI.....

IV. KEBIJAKAN.....

V. FUNGSI DAN ORGANISASI.....

VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO.....

VII. TAHAP FINALISASI, PEMBUATAN, DAN PENANDATANGANAN KONTRAK.....

A. Kegiatan PMO dan/atau Fungsi Peminta pada tahap finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi.....

B. Kegiatan PMO dan/atau Fungsi Peminta pada tahap finalisasi dan penandatanganan Pengadaan Jasa Capex yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi.....

VIII. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK.....

A. Kegiatan Fungsi Pelaksana pada tahap pelaksanaan Perjanjian untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi.....

B. Kegiatan Fungsi Pelaksana pada tahap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Capex yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi.....

C. Kegiatan Fungsi Peminta sebagai Fungsi Pelaksana dan PMO yang menjalankan fungsi monitor pada tahap pelaksanaan Perjanjian untuk Pengadaan Jasa Opex Non-Rutin dengan nilai lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).....

IX. CHANGE ORDER DAN/ATAU KLAIM.....

A. Change Order.....

B. Klaim.....

X. AMENDEMEN KONTRAK.....

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

XI. NOVASI KONTRAK.....

XII. KETENTUAN K3 PADA PERSIAPAN & PELAKSANAAN KONTRAK.....

XIII. PENGECUALIAN / KETENTUAN LAIN-LAIN.....

XIV. KRITERIA KEBERHASILAN.....

XV. *RECORD/FORM* TERKAIT.....

Formulir Order Pembelian.....

Formulir Change Order.....

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PROSEDUR

A. Latar Belakang

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah membuat "Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa" ("**Pedoman**") yang memuat pokok-pokok ketentuan dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup.

2. Pedoman mengatur bahwa proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari 6 (enam) tahapan proses sebagai berikut
   (1) tahap permintaan Pemilihan Penyedia;
   (2) tahap persiapan Pemilihan Penyedia;
   (3) tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
   (4) tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak;
   (5) tahap pelaksanaan Kontrak; dan
   (6) tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

3. Dalam setiap tahapan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut di atas terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh fungsi terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pada setiap tahap Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

4. Prosedur ini berjudul "Prosedur Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak" ("**Prosedur**") yang khusus mengatur mengenai kegiatan-kegiatan dalam tahap:
   - Finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak; dan
   - Pelaksanaan Kontrak.

5. Prosedur untuk tahap lainnya diatur tersendiri.

B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya Prosedur ini adalah agar seluruh pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup dapat memahami bagaimana Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak dan tahap pelaksanaan Kontrak harus dilakukan sehingga proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup dilakukan sesuai tujuan dengan memperhatikan tujuan, prinsip, kebijakan dan etika, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)*, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*) dan nilai budaya AKHLAK.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

C. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Semen Indonesia Grup khususnya dalam tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak, dan tahap pelaksanaan Kontrak, yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan dan/atau AP Semen, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana Perseroan untuk pelaksanaan subsidi/ kompensasi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman dari pemerintah.

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

B. Dokumen Terkait

Berikut adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan Prosedur ini pada saat disusun

1. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor M/SIG/PRO/001;
2. Prosedur Permintaan Pemilihan Penyedia;
3. Prosedur Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
4. Prosedur Penyerahan dan Penerimaan Barang dan/atau Jasa; dan
5. Prosedur Manajemen K3 untuk Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

III. DEFINISI

Seluruh definisi yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Nomor M/SIG/PRO/001 juga berlaku dalam Prosedur ini. Dalam Prosedur ini yang dimaksud dengan

1. **Barang Capex Konstruksi** adalah Barang Capex yang merupakan hasil dari Jasa Pekerjaan Konstruksi.

2. **Barang Capex Non-Konstruksi** adalah Barang Capex selain Barang Capex Konstruksi.

3. **Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi** adalah Barang Capex Non-Konstruksi dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi.

4. **Change Order** adalah semua perubahan ketentuan dalam Kontrak sebelum berakhirnya penyelesaian Pekerjaan.

5. **Contract Manager** adalah personel khusus sebagai tenaga administrasi kontrak yang bertanggung jawab terhadap dokumen finalisasi kontrak dan pelaksanaan kontrak.

6. **Group Head of Plant Operation ("GHOPO")** adalah unit kerja yang merupakan bagian dari struktur organisasi perseroan yang mengelola kegiatan operasional pabrik Perseroan.

7. **Jasa Capex Non-Konstruksi** adalah Jasa Capex selain Jasa Pekerjaan Konstruksi.

8. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja** ("**K3**") adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

9. **Klaim** adalah permintaan perubahan dari Penyedia akibat adanya Change Order atau hal lainnya berdasarkan Perjanjian/Order Pembelian.

10. **Penanganan Keadaan Darurat** adalah penanganan untuk keamanan, keselamatan masyarakat dan aset Semen Indonesia Grup yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan/atau penanganan akibat Keadaan Memaksa.

11. **Perjanjian Konstruksi** adalah Perjanjian yang khusus mengatur mengenai pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi.

12. **Project Manager** adalah orang yang ditunjuk oleh PMO untuk melaksanakan Perjanjian konstruksi, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam instruksi kerja PMO.

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

13. **Project Charter** adalah dokumen yang berisi rencana dan mekanisme pelaksanaan manajemen proyek atas suatu investasi yang telah ditetapkan serta pembagian tanggung jawab atas tim pelaksana proyek.

14. **Sistem Enterprise Resource Planning** (“**Sistem ERP**”) adalah sistem informasi utama yang digunakan oleh Perusahaan untuk menjalankan proses bisnis sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan secara terintegrasi.

15. **Varian K3** adalah sebuah proses manajemen risiko dalam Kontrak yang memberikan kebijakan terhadap Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan K3 agar dapat melakukan pekerjaan untuk Semen Indonesia Grup dengan tetap memastikan keselamatan pekerja dan peralatan melalui tindakan mitigasi.

IV. KEBIJAKAN

Kebijakan untuk Prosedur Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak merujuk kepada ketentuan yang berlaku di Pedoman.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

V. FUNGSI DAN ORGANISASI

Fungsi dan organisasi pada Prosedur Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak merujuk pada Bab VIII. Pelaku Pengadaan dalam Pedoman.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

Risiko dan pengendalian risiko pada tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak dan tahap pelaksanaan Kontrak adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th>KODE</th><th>PROSES/AKTIVITAS</th><th>NAMA RISIKO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">R1</td><td>1. Finalisasi dan penandatanganan Perjanjian
2. Pembuatan dan Penandatanganan Order Pembelian
3. Pelaksanaan Perjanjian
4. Penyerahan Barang dan/atau Jasa</td><td>Keterlambatan pekerjaan</td></tr>
<tr><td colspan="2"><table>
<tr><th>DESKRIPSI RISIKO</th><th>PENGENDALIAN RISIKO</th></tr>
<tr><td>Pelaksanaan pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan</td><td>1. Menunjuk pengawas pekerjaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan
2. Membuat timeline pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian (dan Order Pembelian berdasarkan Perjanjian) untuk memastikan tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan tidak terlambat dilakukan
3. Menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia jika Penyedia tidak melakukan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan Perjanjian
4. Memastikan ketentuan dan mekanisme penalti/denda dalam Perjanjian atas terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia
5. Menerapkan ketentuan Perjanjian terkait penalti/denda kepada Penyedia dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau deviasi lainnya dalam kewajiban pemenuhan jadwal pekerjaan sesuai Kontrak</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

KODE	PROSES/AKTIVITAS	NAMA RISIKO
R2	1. Pelaksanaan Perjanjian 2. Penyerahan Barang dan/atau Jasa	Kualitas hasil pekerjaan
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai Kontrak	1. Penyusunan Persyaratan Pemberi Kerja dan Rancangan Kontrak yang jelas dan terukur 2. Menunjuk pengawas pekerjaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan 3. Menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia jika Penyedia tidak melakukan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan Perjanjian 4. Memastikan ketentuan dan mekanisme penalti/denda dalam Perjanjian atas terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia 5. Menerapkan ketentuan Perjanjian terkait penalti/denda kepada Penyedia dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau deviasi lainnya dalam kewajiban pemenuhan jadwal pekerjaan sesuai Kontrak

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

KODE	PROSES/AKTIVITAS	NAMA RISIKO
R3	1. Pembuatan Change Order 2. Amendemen Kontrak	Perubahan spesifikasi dan *scope*
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Terjadi perubahan spesifikasi dan *scope* yang melampaui batas maksimal perubahan	1. Merencanakan dengan matang penyusunan Permintaan Pemilihan Penyedia 2. Menetapkan kriteria amendemen kontrak, termasuk batas nilai amendemen 3. Memproses dan mengevaluasi perubahan spesifikasi dan *scope* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 4. Memastikan amendemen Kontrak yang terjadi di fase pelaksanaan masih sesuai dan memenuhi kriteria, kondisi, dan aspek-aspek yang berlaku, khususnya terkait batasan maksimal perubahan spesifikasi dan scope sesuai dengan Pedoman dan proses Pengadaan
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R4	Pelaksanaan Perjanjian	Kinerja Penyedia
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Penyedia wanprestasi	1. Melakukan evaluasi kinerja penyedia selama pelaksanaan perjanjian 2. Menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia jika Penyedia tidak melakukan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan Perjanjian 3. Menyusun dan melaksanakan rencana alternatif penyelesaian pekerjaan antara lain melalui skema yang berlaku di Semen Indonesia Grup (i.e percepatan pelaksanaan pekerjaan, Novasi atau terminasi Perjanjian baik seluruh atau sebagian)

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:


KODE	PROSES/AKTIVITAS	NAMA RISIKO
R5	Finalisasi Kontrak	Dokumen finalisasi kontrak
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Dokumen kontrak tidak terdokumentasi dengan baik	1. Menetapkan personel khusus sebagai admin kontrak yang bertanggung jawab terhadap dokumen finalisasi 2. Menyiapkan folder penyimpanan atau *repository* 3. Membuat pencatatan urutan dokumen 4. Penggunaan *share file tracking* di *share drive*
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R6	Pelaksanaan Kontrak (PMO)	*Commencement date* kontrak dan jadwal *kick off meeting* tidak pasti
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Commencement date kontrak dan jadwal *kick off* belum ada kepastian	1. Membuat *timeline* serta rencana proyek secara tepat 2. Monitoring dan evaluasi secara kontinu informasi perkembangan penetapan tanggal yang sesuai untuk dimulainya proyek 3. Membuat pertemuan rutin sebelum pelaksanaan kontrak antara fungsi peminta dengan fungsi penyedia
KODE	**PROSES/AKTIVITAS**	**NAMA RISIKO**
R7	Pelaksanaan Kontrak (PMO)	Jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan tidak berlaku
	DESKRIPSI RISIKO	**PENGENDALIAN RISIKO**
	Jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan oleh pihak penyedia kadaluarsa	1. Melakukan evaluasi secara berkala terkait masa berlaku jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan 2. Memastikan perpanjangan masa berlaku jaminan selama masa kontrak

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

VII. TAHAP FINALISASI, PEMBUATAN, DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

A. Kegiatan PMO dan/atau Fungsi Peminta pada tahap finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi

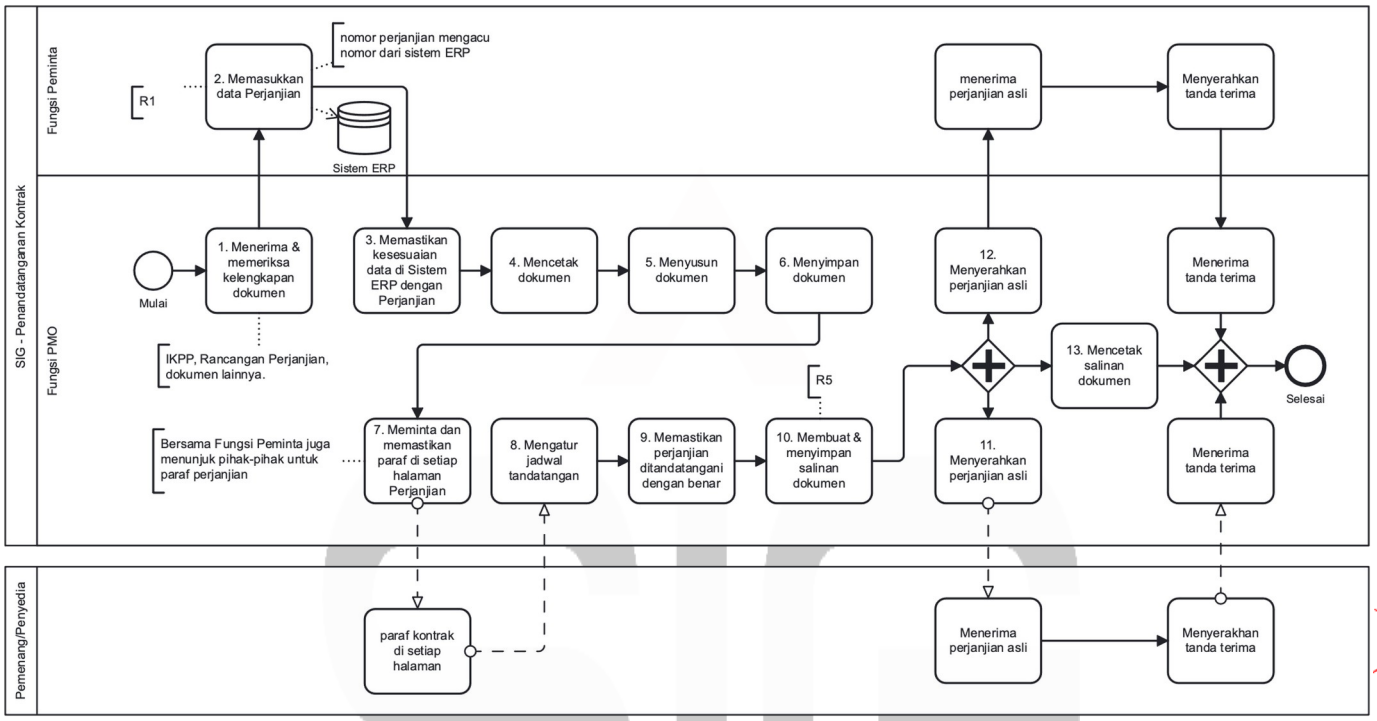

1. PMO menerima dan memeriksa kelengkapan:
   (1) seluruh Dokumen Pengadaan dari Panitia Pengadaan baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, yang berisi fotokopi IKPP, fotokopi rancangan Perjanjian, dan dokumen lainnya terkait dengan pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
   (2) dokumen asli dan fotokopi yang diserahkan oleh Pemenang/Penyedia kepada Panitia Pengadaan untuk keperluan pengadaan terkait, kecuali asli Jaminan Penawaran. Dokumen yang diterima harus dokumen yang terakhir disepakati oleh Panitia Pengadaan dan Pemenang/Penyedia.

2. Fungsi Peminta memasukan data-data Perjanjian ke dalam Sistem ERP yang memuat sekurang-kurangnya antara lain:

   (1) identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing pihak;
   (2) untuk Pengadaan Barang harus memuat: jenis, jumlah dan spesifikasi Barang dan kapan serah terima Barang harus dilakukan;
   (3) untuk Pengadaan Jasa harus memuat: pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
   (4) rujukan Dokumen Pengadaan;

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

(5) harga Barang dan/atau Jasa; dan
(6) syarat-syarat pembayaran Barang dan/atau Jasa.

Untuk selanjutnya nomor dari Sistem ERP dimaksud dicantumkan sebagai nomor Perjanjian.

Mekanisme pemasukan data Perjanjian kedalam Sistem ERP diatur dalam instruksi kerja.

3. PMO memastikan data-data Perjanjian di dalam Sistem ERP tidak bertentangan dengan Perjanjian.

4. PMO mencetak seluruh dokumen yang masih dalam bentuk *softcopy* versi terakhir sebanyak 2 (dua) bundel yang akan menjadi dokumen asli Perjanjian.

5. PMO menyusun seluruh dokumen yang akan menjadi dokumen asli Perjanjian, baik yang dicetak maupun yang asli, sesuai dengan ketentuan dalam rancangan Perjanjian yang telah disepakati oleh Pemenang/Penyedia dan Panitia Pengadaan.

6. PMO memastikan seluruh dokumen yang akan menjadi dokumen asli Perjanjian tersusun sesuai dengan urutannya, dan menempatkannya di tempat yang aman dari potensi penggantian isi Perjanjian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

7. PMO meminta wakil Pemenang/Penyedia dan pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Fungsi Pelaksana (PMO) dan Fungsi Peminta, untuk membubuhkan paraf di setiap halaman Perjanjian, dan memastikan kembali bahwa seluruh halaman Perjanjian telah diparaf oleh pejabat yang berwenang.

8. PMO mengatur jadwal penandatanganan Perjanjian, setelah seluruh halaman Perjanjian diparaf oleh wakil Pemenang/Penyedia dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fungsi Pelaksana (PMO) dan Fungsi Peminta.

9. PMO mengawasi jalannya penandatanganan Perjanjian dan memastikan Perjanjian telah ditandatangani dengan benar oleh:
   (1) Pejabat Yang Berwenang; dan
   (2) wakil Penyedia yaitu orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia.

10. PMO membuat fotokopi atau *scan* Perjanjian dan seluruh lampiran-lampirannya, dan memastikan seluruh halaman dari Perjanjian telah ter-*copy* dengan benar dan lengkap dan menyimpan *softcopy*-nya sesuai dengan ketentuan PMO.

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

11. PMO menyerahkan 1 (satu) Perjanjian yang asli, yaitu yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang di atas meterai, kepada Penyedia dan meminta tanda tangan wakil Penyedia sebagai tanda terima penyerahan asli Perjanjian.

12. PMO menyerahkan 1 (satu) Perjanjian yang asli yaitu yang ditandatangani oleh wakil Penyedia di atas meterai, kepada Fungsi Peminta dan meminta tanda tangan Fungsi Peminta sebagai tanda terima penyerahan asli Perjanjian.


13. PMO mencetak dari *softcopy* Perjanjian sejumlah minimal 3 (tiga) bundel sebagai salinan Perjanjian dan menyerahkannya kepada Project Manager, Contract Manager, dan PMO untuk disimpan.

14. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh Fungsi Pelaksana yang menangani *project management* di lingkungan AP Semen atau GHOPO serta menyampaikan salinan Kontrak ke PMO untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, dan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh PMO sebagai Fungsi Pelaksana.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

B. Kegiatan PMO dan/atau Fungsi Peminta pada tahap finalisasi dan penandatanganan Pengadaan Jasa Capex yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi

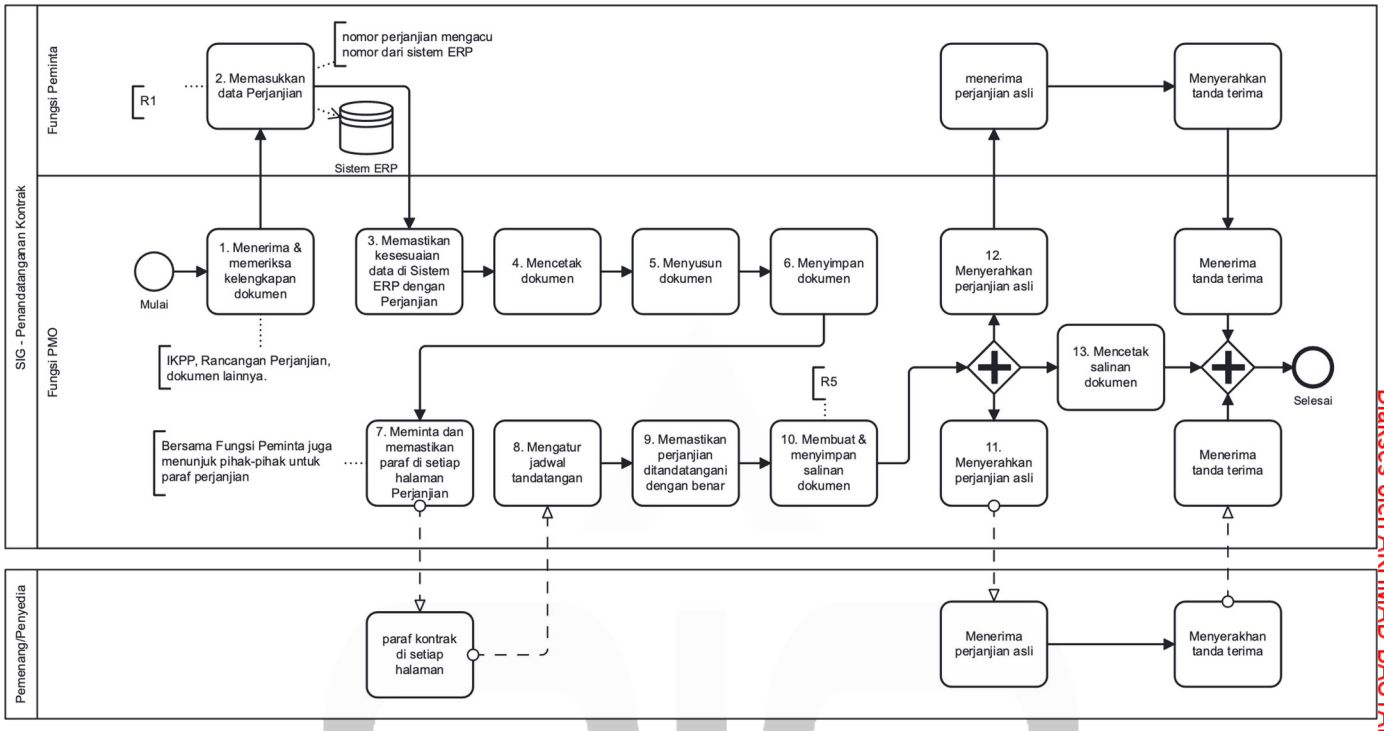

1. PMO menerima dan memeriksa kelengkapan
   (1) seluruh Dokumen Pengadaan dari Panitia Pengadaan baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, yang berisi fotokopi IKPP, fotokopi rancangan Kontrak, dan dokumen lainnya terkait dengan pengadaan Barang; dan
   (2) dokumen asli dan fotokopi yang diserahkan oleh Pemenang/ Penyedia kepada Panitia Pengadaan untuk keperluan pengadaan terkait, kecuali asli Jaminan Penawaran. Dokumen yang diterima harus dokumen yang terakhir disepakati oleh Panitia Pengadaan dan Pemenang/Penyedia.

2. Fungsi Peminta memasukan data-data Kontrak Konstruksi kedalam sistem ERP yang memuat sekurang-kurangnya antara lain:

   (1) identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing pihak;
   (2) pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
   (3) rujukan Dokumen Pengadaan;
   (4) nilai Jasa; dan
   (5) syarat-syarat pembayaran Jasa.

   Untuk selanjutnya nomor dari Sistem ERP dimaksud dicantumkan sebagai nomor Kontrak.

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Mekanisme pemasukan data Kontrak kedalam Sistem ERP diatur dalam instruksi kerja.

3. PMO memastikan data-data Perjanjian di dalam sistem ERP tidak bertentangan dengan Kontrak Konstruksi.

4. PMO mencetak seluruh dokumen yang masih dalam bentuk *softcopy* versi terakhir sebanyak 2 (dua) bundel yang akan menjadi dokumen asli Kontrak Konstruksi.

5. PMO menyusun seluruh dokumen yang akan menjadi dokumen asli Perjanjian Konstruksi, baik yang dicetak maupun yang asli, sesuai dengan ketentuan dalam rancangan Perjanjian Konstruksi yang telah disepakati oleh calon Penyedia dan Panitia Pengadaan.

6. PMO memastikan seluruh dokumen yang akan menjadi dokumen asli Perjanjian Konstruksi tersusun sesuai dengan urutannya, dan menempatkannya di tempat yang aman dari potensi penggantian isi Perjanjian Konstruksi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

7. PMO meminta wakil Pemenang/Penyedia dan pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Fungsi Pelaksana (PMO) dan Fungsi Peminta, untuk membubuhkan paraf di setiap halaman Perjanjian Konstruksi, dan memastikan kembali bahwa seluruh halaman Perjanjian Konstruksi telah diparaf oleh orang yang berwenang.

8. PMO mengatur jadwal penandatanganan Perjanjian Konstruksi, setelah seluruh halaman Perjanjian Konstruksi diparaf oleh wakil Pemenang/Penyedia dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fungsi Pelaksana (PMO) dan Fungsi Peminta.

9. PMO mengawasi jalannya penandatanganan Perjanjian Konstruksi dan memastikan Perjanjian Konstruksi telah ditandatangani dengan benar oleh:
   (1) Pejabat Yang Berwenang; dan
   (2) wakil Penyedia yaitu orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia.

10. PMO membuat fotokopi atau *scan* Perjanjian Konstruksi dan seluruh lampiran-lampirannya, dan memastikan seluruh halaman dari Perjanjian telah difotokopi dengan benar dan lengkap dan menyimpan *softcopy*-nya sesuai dengan ketentuan PMO.

11. PMO menyerahkan 1 (satu) Perjanjian Konstruksi yang asli, yaitu yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang di atas meterai, kepada

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Penyedia dan meminta tanda tangan wakil Penyedia sebagai tanda terima penyerahan asli Perjanjian Konstruksi.

12. PMO menyerahkan 1 (satu) Perjanjian Konstruksi yang asli, yaitu yang ditandatangani oleh wakil Penyedia di atas meterai, kepada Fungsi Peminta.

13. PMO mencetak dari *softcopy* Perjanjian Konstruksi minimal 3 (tiga) bundel sebagai salinan Perjanjian Konstruksi, dan menyerahkannya kepada: Project Manager, Contract Manager, dan PMO untuk disimpan.


14. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh Fungsi Pelaksana yang menangani *project management* di lingkungan AP Semen atau GHOPO serta menyampaikan salinan Perjanjian ke PMO untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, dan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh PMO sebagai Fungsi Pelaksana.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

VIII. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK

A. Kegiatan Fungsi Pelaksana pada tahap pelaksanaan Perjanjian untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi

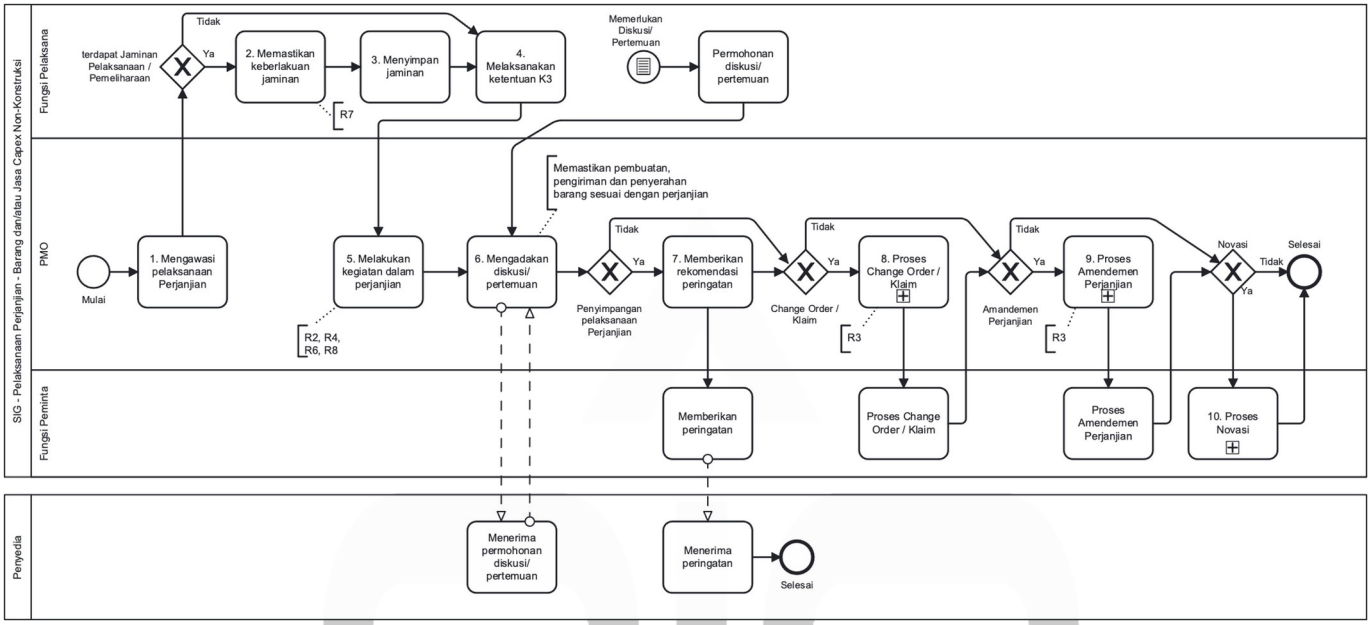

1. PMO mengawasi pelaksanaan Perjanjian untuk memastikan penyerahan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi oleh Penyedia sesuai dengan Perjanjian, baik kualitas, kuantitas, dan jadwal penyerahan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi.

2. Fungsi Pelaksana memastikan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan selama pelaksanaan Perjanjian, jika ada.

3. Fungsi Pelaksana menyimpan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan, jika ada.

4. Melaksanakan ketentuan K3 sebagaimana diatur pada Bab XII Prosedur ini, khususnya untuk pekerjaan atau Penyedia dengan kategori 3 & 4.

5. PMO melaksanakan kegiatan dan hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

6. PMO mengadakan diskusi/pertemuan dengan Penyedia dan/atau pihak terkait lainnya untuk memastikan pembuatan, pengiriman, dan penyerahan Barang dan/atau Jasa Capex Non-Konstruksi sesuai dengan Perjanjian dan hal-hal lainnya sebagaimana menurut pertimbangan Fungsi Pelaksana diperlukan.

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

7. PMO memberi rekomendasi kepada Fungsi Peminta untuk memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia jika Penyedia dalam melaksanakan Perjanjian terdapat penyimpangan dan melakukan langkah-langkah yang perlu diambil guna melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian.


8. PMO dan Fungsi Peminta memastikan Change Order dan/atau Klaim, jika ada, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab IX Prosedur ini.

9. PMO dan Fungsi Peminta memastikan amendemen terhadap Perjanjian, jika ada, dilaksanakan sesuai ketentuan Bab X Prosedur ini.

10. Fungsi Peminta memastikan novasi, jika ada, dilakukan sesuai ketentuan Bab XI Prosedur ini.

11. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh Fungsi Pelaksana yang menangani *project management* di lingkungan AP Semen atau GHOPO serta menyampaikan salinan Perjanjian ke PMO untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, dan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex Non Konstruksi dengan nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh PMO sebagai Fungsi Pelaksana.

B. Kegiatan Fungsi Pelaksana pada tahap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Capex yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi

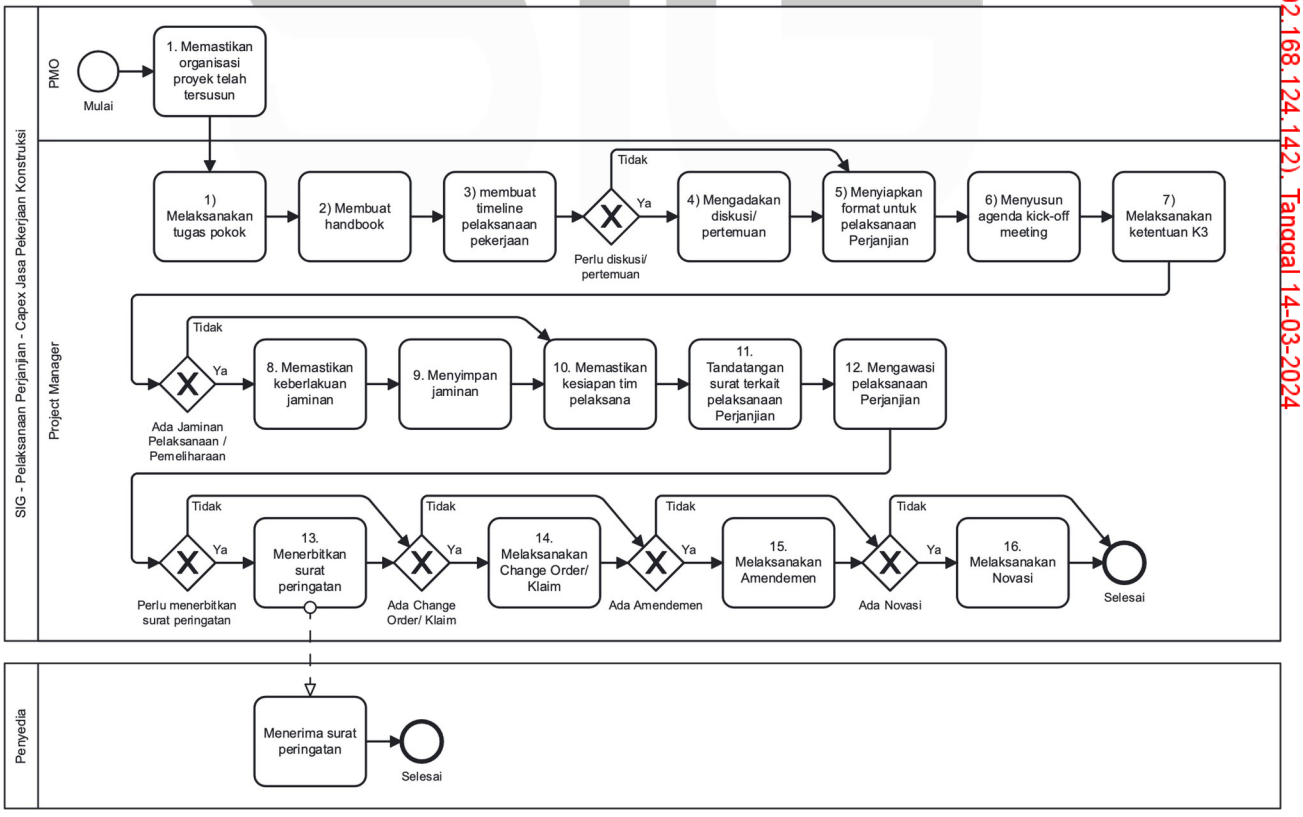

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

1. PMO memastikan organisasi proyek telah tersusun dan Project Manager, telah ditunjuk.

2. Project Manager yang ditunjuk PMO antara lain harus:

   (1) bertanggungjawab kepada PMO atas pelaksanaan Perjanjian Konstruksi, termasuk penyerahan hasil proyek kepada Fungsi Peminta sesuai dengan Perjanjian Konstruksi, Project Charter dan tugas pokok fungsi Project Manager.

   (2) membuat *handbook* Perjanjian Konstruksi yang mudah dibawa, dibaca, dimengerti dan dilaksanakan.

   (3) membuat *timeline* pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Konstruksi untuk memastikan tanggal – tanggal penting terkait pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan tidak terlambat dilakukan, dan diselesaikan, termasuk membuat catatan-catatan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Konstruksi.

   (4) diskusi dengan pihak-pihak terkait pekerjaan Konstruksi termasuk diskusi dengan Fungsi Peminta, jika menurut Project Manager hal tersebut perlu dilakukan.

   (5) menyiapkan seluruh format-format yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Konstruksi sebagai bahan diskusi dalam *kick off meeting*.

   (6) menyusun agenda *kick off meeting*.

   (7) melaksanakan ketentuan K3 sebagaimana diatur pada Bab XII Prosedur ini khususnya untuk pekerjaan atau Penyedia dengan risiko kategori 3 & 4 sebagaimana yang diatur dalam prosedur manajemen K3 untuk penyedia.

   (8) memastikan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan, jika ada.

   (9) Menyimpan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan, jika ada.

   (10) Memastikan kesiapan tim pelaksana, termasuk memastikan terbitnya surat keputusan Perseroan mengenai pengangkatan untuk tim pelaksana dalam organisasi proyek, jika diperlukan.

   (11) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Konstruksi baik kepada Penyedia maupun pihak lain, atau

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

instansi pemerintah, termasuk mengundang Penyedia untuk mengikuti *kick off meeting,* menerbitkan surat perintah mulai kerja, dan komunikasi lainnya selama pelaksanaan Perjanjian Konstruksi.

(12) Mengawasi pelaksanaan Perjanjian Konstruksi untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan Perjanjian Konstruksi.

(13) Menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konstruksi.

(14) Memastikan Change Order dan/atau Klaim, jika ada, dilaksanakan sesuai ketentuan Bab IX Prosedur ini.

(15) Memastikan amendemen Perjanjian Konstruksi, jika ada, dilaksanakan sesuai ketentuan Bab X Prosedur ini.


(16) Memastikan novasi terhadap Perjanjian Konstruksi, jika ada, dilaksanakan sesuai ketentuan Bab XI Prosedur ini.

(17) Untuk Pengadaan Jasa Capex, yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi yang menghasilkan Barang Capex Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh Fungsi Pelaksana di lingkungan AP Semen atau GHOPO serta menyampaikan salinan Perjanjian ke PMO untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, dan untuk Pengadaan Jasa Capex, yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi yang menghasilkan Barang Capex Konstruksi dengan nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dilaksanakan oleh PMO sebagai Fungsi Pelaksana.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

C. Kegiatan Fungsi Peminta sebagai Fungsi Pelaksana dan PMO yang menjalankan fungsi monitor pada tahap pelaksanaan Perjanjian untuk Pengadaan Jasa Opex Non-Rutin dengan nilai lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)

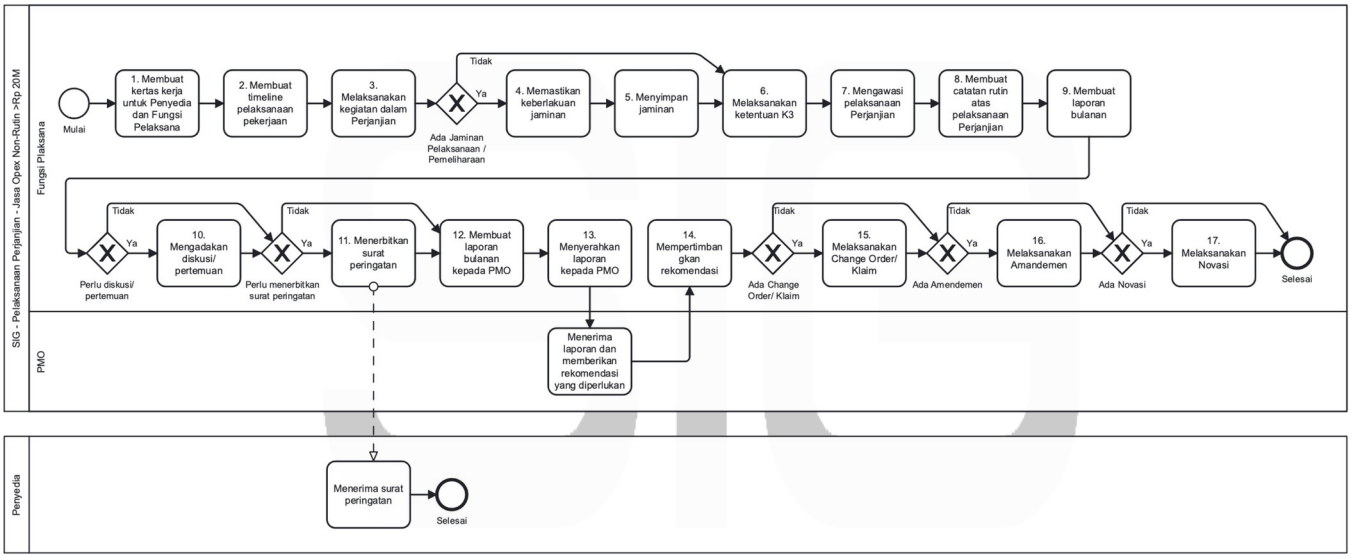

1. Kegiatan Fungsi Pelaksana

(1) Membuat 2 (dua) kertas kerja, yaitu:
   (i) kertas kerja Penyedia, yang mencantumkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Perjanjian; dan
   (ii) kertas kerja Fungsi Pelaksana, yang mencantumkan kegiatan yang harus dilakukan oleh Fungsi Pelaksana berdasarkan Perjanjian.

(2) Membuat *timeline* pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian untuk memastikan tanggal – tanggal penting terkait pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan tidak terlambat dilakukan, termasuk membuat catatan-catatan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Catatan Dari:

(3) Melaksanakan kegiatan dan hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

(4) Memastikan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan, jika ada.

(5) Menyimpan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan, jika ada.

(6) Melaksanakan ketentuan K3 sebagaimana diatur pada Bab XII Prosedur ini khususnya untuk pekerjaan atau Penyedia dengan risiko kategori 3 & 4 sebagaimana yang diatur dalam prosedur manajemen K3 untuk penyedia.

(7) Mengawasi pelaksanaan Perjanjian untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan Perjanjian.

(8) Membuat catatan harian, mingguan, bulanan atas pelaksanaan Perjanjian.

(9) Membuat laporan bulanan dan mencatat dalam:
   (i) kertas kerja Penyedia mengenai sesuai atau tidaknya realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan Perjanjian; dan
   (ii) kertas kerja Fungsi Pelaksana mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan oleh Fungsi Pelaksana dibandingkan dengan Perjanjian dan target pencapaiannya Fungsi Pelaksana.

(10) Mengadakan diskusi/pertemuan dengan Penyedia dan/atau pihak terkait lainnya untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan/atau Perjanjian dan hal-hal lainnya sebagaimana menurut pertimbangan Fungsi Pelaksana diperlukan.

(11) Menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai ketentuan Perjanjian jika Penyedia tidak melakukan pekerjaan atau melaksanakan Pekerjaan tetapi tidak sesuai Perjanjian.

(12) Berdasarkan kertas kerja Penyedia, setiap bulan membuat laporan kepada PMO mengenai pelaksanaan Perjanjian, yang berisi antara lain perbandingan antara rencana kerja dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan realisasinya, rencana yang akan dilakukan Penyedia jika ada keterlambatan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan kepada PMO (“**Laporan Pelaksanaan Perjanjian**”).

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

(13) Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Perjanjian kepada PMO selambat-lambatnya pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

(14) Terhadap tanggapan atau saran atau rekomendasi dari PMO, Fungsi Pelaksana dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan saran atau rekomendasi tersebut.

(15) Mengelola dan memastikan Change Order dan/atau Klaim, jika ada, dilakukan sesuai ketentuan Bab IX Prosedur ini.

(16) Memastikan amendemen Perjanjian, jika ada, dilaksanakan sesuai ketentuan Bab X Prosedur ini.

(17) Memastikan novasi Perjanjian, jika ada, dilakukan sesuai ketentuan Bab XI Prosedur ini.

2. Kegiatan oleh PMO

(1) Memonitor pelaksanaan Perjanjian berdasarkan Laporan Pelaksanaan Perjanjian untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan Perjanjian dengan realisasinya, terutama terhadap waktu penyelesaian pekerjaan, untuk dianalisa apakah jika ada keterlambatan penyelesaian akan mengganggu rencana kerja Semen Indonesia Grup secara keseluruhan.


(2) Membuat tanggapan atau saran atau rekomendasi untuk diserahkan kepada Fungsi Pelaksana.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

IX. CHANGE ORDER DAN/ATAU KLAIM

A. Change Order

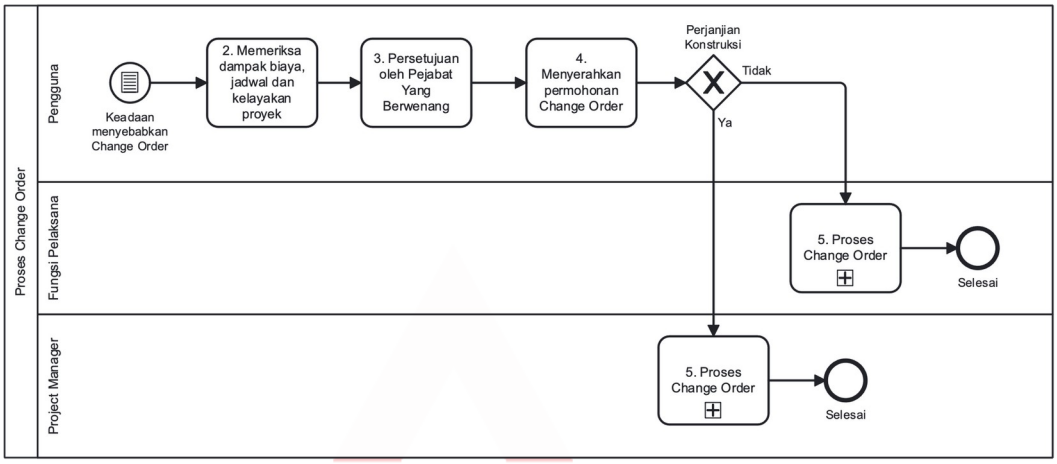

1. Permintaan Change Order dapat diajukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian/Order Pembelian, antara lain adanya: perubahan peraturan perundangan, perubahan lingkup Pekerjaan baik penambahan atau pengurangan, keadaan memaksa *(force majeure),* atau hal-hal lain yang dikehendaki oleh Pengguna.

2. Dalam hal permintaan Change Order menimbulkan dampak biaya dan/atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau hal-hal lain yang mempengaruhi kelayakan proyek (IRR atau NPV atau *Payback Period*) yang melewati batasan maksimal sebagaimana diatur dalam pedoman/Pedoman/prosedur/kebijakan lainnya dalam Semen Indonesia Grup, maka harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang.

3. Permintaan Change Order harus memperoleh persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang yang menandatangani Perjanjian/Order Pembelian.

4. Setelah memperoleh persetujuan, permintaan Change Order diserahkan kepada Fungsi Pelaksana dari masing-masing Perjanjian/Order Pembelian.

5. Terhadap permintaan Change Order tersebut, maka tugas **Project Manager** untuk Perjanjian Konstruksi atau **Fungsi Pelaksana** untuk Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi, antara lain:

   (1) memastikan permintaan Change Order telah disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang sudah memuat informasi mengenai perubahan kualitas Jasa dan/atau Barang, dan/atau keterlambatan penyerahan Jasa dan/atau Barang;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

(2) memastikan Change Order dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi;

(3) meminta Penyedia untuk menyerahkan proposal harga dan hal-hal terkait lainnya, termasuk menjelaskan akibat dari dilaksanakannya Change Order terhadap kualitas dan jadwal penyelesaian pekerjaan, jika ada, dalam waktu tertentu yang dianggap layak ("**Proposal Klaim Berdasarkan Change Order**");

(4) setelah Penyedia menyerahkan Proposal Klaim Berdasarkan Change Order, mengevaluasinya baik secara teknis dan harga, dan jika dianggap perlu meminta penjelasan dari Penyedia dan/atau pihak terkait lainnya. Setiap diskusi dengan Penyedia dan/atau pihak terkait lainnya, harus dibuat berita acara rapat. Hasil evaluasi atas Proposal Klaim Berdasarkan Change Order dituangkan dalam laporan yang mencantumkan antara lain hasil evaluasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan ("**Laporan Hasil Evaluasi Proposal Klaim Berdasarkan Change Order**");

(5) menyerahkan Hasil Evaluasi Proposal Klaim Berdasarkan Change Order kepada PMO dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian Konstruksi) atau kepada Fungsi Peminta (untuk Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi), untuk dimintakan persetujuan;

(6) dalam hal Fungsi Peminta tidak memberikan persetujuan atas Change Order, maka tidak ada Change Order;

(7) dalam hal Fungsi Peminta memberikan persetujuan atas Change Order maka Fungsi Peminta:


(a) menyiapkan amendemen Perjanjian Konstruksi; dan

(b) melakukan finalisasi amendemen Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi dan menyiapkan penandatanganannya, termasuk memastikan Pejabat Yang Berwenang menandatangani amendemen dimaksud telah sesuai dengan Batas Kewenangan yang diatur dalam Pedoman.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

B. Klaim

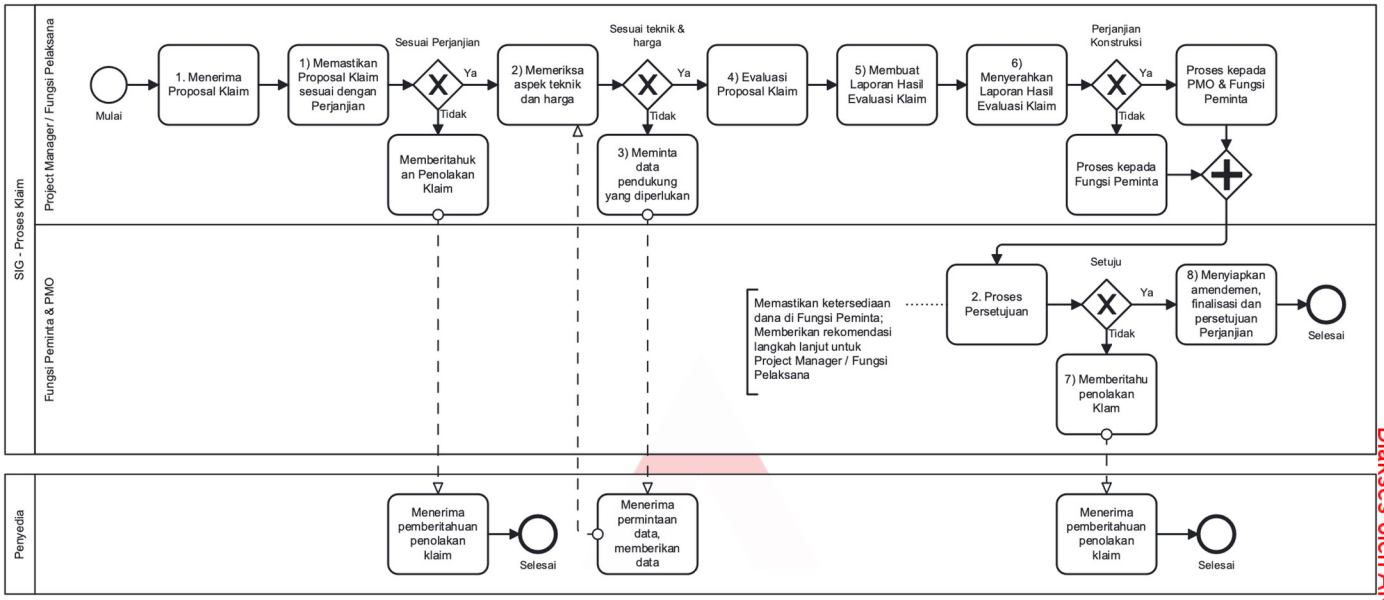

Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi, Penyedia mengajukan kepada Project Manager (untuk Perjanjian Konstruksi) atau kepada Fungsi Pelaksana (untuk Perjanjian/Order selain Perjanjian Konstruksi) proposal mengenai klaim tambahan biaya dan/atau tambahan waktu penyerahan Jasa dan/atau Barang ("**Proposal Klaim**") sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian, maka:

1. Project Manager atau Fungsi Pelaksana setelah menerima Proposal Klaim, harus melakukan antara lain:

   (1) memastikan Proposal Klaim sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian. Jika tidak sesuai, harus memberitahukan penolakan secara tertulis kepada Penyedia;
   (2) apabila Proposal Klaim telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian, maka Project Manager atau Fungsi Pelaksana memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dari aspek teknik dan harga dalam dokumen pendukung Proposal Klaim;
   (3) jika dokumen pendukung tidak sesuai, meminta secara tertulis kepada Penyedia untuk menyerahkan data pendukung yang diperlukan hingga terpenuhinya data pendukung untuk dapat dilakukan evaluasi;
   (4) melakukan evaluasi Proposal Klaim berdasarkan Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi, termasuk melakukan klarifikasi atas data pendukung

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

Proposal Klaim. Setiap diskusi dengan Penyedia dan/atau pihak terkait lainnya, harus dibuat berita acara rapat;

(5) membuat laporan hasil evaluasi yang memuat antara lain hasil evaluasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan Proposal Klaim ("**Laporan Hasil Evaluasi Proposal Klaim**");

(6) menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Proposal Klaim kepada PMO dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian Konstruksi) atau kepada Fungsi Peminta (untuk Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi), dan meminta persetujuan;

(7) jika PMO dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian Konstruksi) dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi) tidak memberikan persetujuan, memberitahukan kepada Penyedia secara tertulis mengenai penolakan Klaim;

(8) jika PMO dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian Konstruksi) dan Fungsi Peminta (untuk Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi) memberikan persetujuan, maka:

(a) menyiapkan amendemen Perjanjian Konstruksi; dan

(b) melakukan finalisasi amendemen Perjanjian Konstruksi atau Perjanjian/Order Pembelian selain Perjanjian Konstruksi dan menyiapkan penandatanganannya, termasuk memastikan Pejabat Yang Berwenang menandatangani amendemen dimaksud telah sesuai dengan Batas Kewenangan yang diatur dalam Pedoman.

2. PMO dan/atau Fungsi Peminta melakukan, antara lain:

(1) setelah menerima Laporan Hasil Evaluasi Proposal Klaim, memastikan tersedianya dana di Fungsi Peminta, dan memberikan rekomendasi langkah lanjut yang perlu dilakukan oleh Project Manager atau Fungsi Pelaksana;

(2) PMO dalam memberikan persetujuan dan rencana tindak lanjut harus sesuai dengan ketentuan dalam instruksi kerja PMO.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

X. AMENDEMEN KONTRAK

Amendemen Kontrak dilakukan dengan ketentuan:

1. Pengertian amendemen mencakup perubahan, penambahan dan/atau pengurangan terhadap ketentuan Kontrak.

2. Amendemen terkait perubahan jangka waktu untuk Kontrak yang memiliki kegiatan dan pihak yang sama, hanya dapat dilakukan apabila dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan/atau proses penunjukan Penyedia yang baru belum selesai namun jangka waktu Kontrak akan berakhir.

3. Amendemen Kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati para pihak dalam Kontrak.

4. Amendemen Kontrak harus ditandatangani oleh:
   (1) Pejabat Yang Berwenang berdasarkan total nilai harga pekerjaan ditambah nilai Change Order atau nilai Klaim, jika ada; dan
   (2) wakil Penyedia yaitu orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia.

5. Amendemen Kontrak berlaku setelah ditandatangani para pihak dalam Kontrak atau waktu lain yang disepakati dalam amendemen Kontrak.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

XI. NOVASI KONTRAK

Novasi Perjanjian/Order Pembelian dilakukan dengan ketentuan:

1. Novasi hanya dapat dilakukan untuk mengganti Perseroan atau AP Semen sebagai pihak dalam Perjanjian/Order Pembelian dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan atau AP Semen ("**Pihak Baru**").

2. Novasi Perjanjian/Order Pembelian harus disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian/Order Pembelian dan Pihak Baru, yang dituangkan dalam dokumen novasi yang ditandatangani oleh:
   (1) Pejabat Yang Berwenang; dan
   (2) wakil Pihak Baru yaitu orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pihak Baru; dan
   (3) wakil Penyedia yaitu orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penyedia tersebut.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

XII. KETENTUAN K3 PADA PERSIAPAN & PELAKSANAAN KONTRAK

A. Ketentuan K3 pada Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum dimulainya pelaksanaan kontrak, Fungsi Pelaksana wajib memastikan bahwa pengaturan yang baik telah dilakukan, untuk memastikan Penyedia telah mempersiapkan diri agar sesuai dengan persyaratan K3 yang disebutkan dalam kontrak. Pengaturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Pelaksana dan Penyedia melaksanakan forum pertemuan awal yang akan menerangkan persyaratan K3 secara detil untuk permulaan kontrak. Pertemuan ini juga akan menerangkan kewajiban K3 yang harus dijalankan apabila Varian K3 dikeluarkan terhadap Penyedia tersebut;
2. komunikasi mengenai tanggungjawab antara Fungsi Pelaksana dan Penyedia, meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a) pelaporan frekuensi dan yang diharapkan;
   b) cara mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan K3 akan diputuskan antara Fungsi Pelaksana dengan Penyedia;
   c) mengklarifikasikan masalah yang mungkin akan terantisipasi selama kontrak berjalan;
   d) otoritas menghentikan pekerjaan jika terjadi pelanggaran K3;
   e) alokasi atau penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan yang mencukupi;
   f) konfirmasi bahwa Penyedia telah menunjuk sumber daya yang memadai untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan cakupannya.
3. verifikasi perijinan dan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan Penyedia;
4. memastikan bahwa semua karyawan Penyedia telah di induksi mengenai persyaratan K3 dari Perseroan;
5. memastikan bahwa semua karyawan Penyedia melakukan *medical check up* sebelum bekerja dan akan dilakukan secara berkala setiap tahun;
6. instruksi spesifik yang diberikan kepada karyawan Penyedia mengenai bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan, atau bukti yang menunjukkan bahwa Penyedia telah melakukan instruksi ini;
7. menjalankan proses inspeksi dan testing untuk memastikan bahwa semua peralatan dan material yang digunaan dalam kontrak sesuai dengan persyaratan K3 Perseroan dan pencatatan dari inspeksi ini disimpan;
8. Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan harus disebutkan dalam *job safety analysis*;
9. persyaratan baju kerja Penyedia harus memenuhi standar Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
   a) Penyedia yang bekerja di area pabrik harus memakai baju berwarna terang dengan retroreflektor. Jika tidak, rompi berwarna terang dengan retroreflektor harus dipakai;
   b) warna primer bahan dasar terang untuk baju Penyedia adalah kuning terang (RAL 1026), merah terang (RAL 3026), atau hijau (RAL 6038)

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Warna	Kode RAL	Sampel Warna
Hijau Terang	RAL 6038 - Luminous Green	
Kuning Terang	RAL 1026 - Luminous Yellow	
Merah Terang	RAL 3026 - Luminous Bright Red	

c) warna sekunder ditentukan oleh Penyedia sebagai kombinasi dari warna dasar Luas minimal bahan dasar terang ≥ 70% untuk seragam dan 100% untuk rompi;
d) seragam / rompi harus memiliki ≥ 2 band retroreflektif horisontal dan ≥ 1 band vertikal atas setiap bahu dan bisa dilihat dari sudut manapun 360°;
e) jarak antara band retroreflektif minimal 50 mm satu sama lain;
f) lebar band retroreflektif adalah ≥ 50 mm;
g) untuk Penyedia di dalam site, luas bahan dasar ≥ 0.5 m^2 dan luas bahan retroreflektif adalah ≥ 0.13 m^2 atau sesuai persyaratan garment class 2;
h) untuk Penyedia transporter offsite, luas bahan dasar ≥ 0.8 m^2 dan luas bahan retroreflektif adalah ≥ 0.2 m^2 .

10. warna helm untuk Penyedia adalah kuning;
11. untuk Penyedia baru, bisa memakai helm warna hijau untuk masa orientasi. Mekanisme masa orientasi ditentukan oleh Fungsi Pelaksana;
12. untuk kontrak yang telah diberikan kepada Penyedia kategori 3 dan 4 untuk durasi lebih lama dari 14 hari, maka Penyedia harus membuat Rencana Menajemen K3 di mana rencana tersebut disetujui oleh Fungsi Pelaksana sebelum dimulainya kontrak;
13. di dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Fungsi Pelaksana dapat meminta bantuan kepada fungsi yang menangani K3 di Semen Indonesia Grup.

B. Ketentuan K3 pada Pelaksanaan Kontrak

Fungsi Pelaksana harus memastikan bahwa penilaian secara memadai telah dilakukan untuk mengawasi performa K3 pada setiap pekerjaan. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, baik oleh Fungsi Pelaksana maupun Penyedia, antara lain:

1. memastikan bahwa pengawasan yang mencukupi telah tersedia dan pengawas yang ditugaskan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya yang terkait;
2. menerapkan cara untuk menginformasikan kepada karyawan Penyedia mengenai bahaya dan cara penanganannya sebelum dimulainya pekerjaan, antara lain menyangkut:
   a) identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko;
   b) *Job Safety Analysis* (JSA);

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

c) sistem ijin kerja (ruang tertutup, kerja panas, penggalian dan ekskavasi, dll);
d) prosedur kerja aman;
e) referensi teknis (perusahaan, industri, atau standar internasional).

3. melaksanakan *safety observation* dan inspeksi berkala untuk mengevaluasi kondisi operasi dan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Observasi dan inspeksi bisa dilakukan oleh pengawas Penyedia atau oleh Fungsi Pelaksana, hasil observasi dan inspeksi harus tercatat;
4. pemeriksaan untuk memastikan peralatan dan material yang digunakan dijaga dalam keadaan yang aman digunakan, dan jika ditemukan alat rusak maka alat tidak boleh dipakai sampai dengan diperbaiki. Sebelum dipakai bekerja, seluruh peralatan milik Penyedia harus diinspeksi oleh Fungsi Pelaksana, dan hanya alat yang memenuhi persyaratan yang bisa digunakan di dalam pabrik. Program inspeksi berkala harus dibuat dan stiker inspeksi yang valid akan ditempelkan pada peralatan yang lolos inspeksi;
5. memenuhi kebutuhan medical check up dengan rekomendasi persyaratan usia bekerja di pabrik atau lapangan sesuai dengan pekerjaan;
6. memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. penyediaan sumber daya atau peralatan khusus untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya; termasuk juga aplikasi dari persyaratan yang diatur dalam sistem ijin kerja;
8. pelaporan dari bahaya dan kecelakaan yang terjadi pada saat dilakukan pekerjaan;
9. komunikasi secara regular dan pelaporan mengenai performa K3 Penyedia kepada Perseroan. Pelaporan harus menyertakan statistik kecelakaan dan aktivitas/program yang dijalankan untuk keselamatan kerja. Silakan lihat lampiran;
10. koordinasi dari aktivitas di mana servis kontrak dari pekerjaan tersebut saling terkait atau jika pekerjaan tersebut mengganggu operasi normal;
11. perubahan dari cakupan pekerjaan (*scope of work*) atau metode kerja (*work method*) yang disetujui perlu dilakukan penilaian risiko dan disetujui oleh Fungsi Pelaksana dan Penyedia sebelum perubahan dilakukan;
12. untuk Penyedia kategori 3 & 4, jika kontrak lebih dari 3 bulan maka Fungsi Pelaksana harus melakukan tinjauan dan evaluasi secara formal untuk performa K3 Penyedia. Tinjauan ini akan mencatat performa K3 Penyedia berdasarkan persyaratan dari Semen Indonesia Grup dan rencana perbaikan secara rinci yang harus dilakukan oleh Penyedia. Peninjauan 3 bulanan harus dilakukan secara berkala untuk kontrak jangka panjang (lebih dari 6 bulan);
13. apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan K3 akan merujuk ke pinalti yang ditentukan di dalam kontrak;
14. Di dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Fungsi Pelaksana dapat meminta bantuan kepada fungsi yang menangani K3 di Semen Indonesia Grup.

Catatan Dari:

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

XIII. PENGECUALIAN / KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sebagian atau seluruh ketentuan dalam Prosedur ini tidak dapat dilaksanakan, maka untuk menjaga kelancaraan operasional Semen Indonesia Grup, PMO atau Fungsi Peminta atau Fungsi Pengadaan, sebagai Fungsi Pelaksana dapat meminta persetujuan kepada Direktur Operasi atau Direktur lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama Perseroan.

2. Fungsi Pelaksana wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan Kontrak.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang Opex, Pengadaan Jasa Opex Non-Rutin dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), Pengadaan Jasa Opex Rutin dan Penanganan Keadaan Darurat, akan diatur lebih lanjut dalam prosedur terpisah.

4. Dengan berlakunya Prosedur ini, maka Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. P/SIG/PRO/001 Revisi ke 1 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa dinyatakan tidak berlaku.

XIV. KRITERIA KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak adalah jika

1. seluruh pelaku Pengadaan di lingkungan Semen Indonesia Grup dapat memahami bagaimana Pengadaan dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan;
2. tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
3. kontrak yang ditandatangani sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Semen Indonesia Grup.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

XV. *RECORD/FORM* TERKAIT

1. Formulir Order Pembelian.
2. Formulir Change Order.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

LAMPIRAN I

Formulir Order Pembelian

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk NPWP : 01.001.631.9-051.00 Address : South Quarter, Tower A, Lt.19-20, Jl. R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat, 12430. Tel. No : +62 215261174-5	**ORDER PEMBELIAN / PURCHACE ORDER** No : ..... Nomor ini harap disebutkan pada semua dokumen yang berhubungan dengan Order Pembelian ini / This number must appear on all related document	RFQ No. : RFQ Date : Term of Payment : Term of Delivery : Loading Port : Unloading Port : Country of Origin : Delivery Address : Request by :
To : Adress : Email :	Supplier Code : Supplier Bank Reference No. :	Order Date : Delivery Date :

No.	Goods / Service Description	Qty UoM	Unit Price	Amount .....

Terbilang / Amount in Word : .....

.....
Harga belum termasuk PPN / Price Excl. VAT

Order Pembelian yang sudah ditandatangani & disertai stempel asli agar dikirimkan ke alamat ..... ditujukan kepada .....
Signed & original stamped Purchase Order must be sent to PT Semen Indonesia (Persero) at ..... addressed to .....

Supplier	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Name : Position : Signature : (Sufficient Duty & signed — Stamp stamped)	Name : Position : Signature :

PERHATIAN / ATTENTION
Dibalik halaman ini tercantum syarat dan ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Pembelian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian / Behind this side, the terms and conditions are part of this Purchase Order, and have the sam legal force as the agreement

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk **NPWP** : 01.001.631.9-051.00 **Address** : South Quarter, Tower A, Lt.19-20, Jl. R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat, 12430. **Tel. No** : +62 215261174-5	**ORDER PEMBELIAN / PURCHACE ORDER** **No : .....** Nomor ini harap disebutkan pada semua dokumen yang berhubungan dengan Order Pembelian ini / This number must appear on all related document	RFQ No. : RFQ Date : Term of Payment : Term of Delivery : Loading Port : Unloading Port : Country of Origin : Delivery Address : Request by :
To : **Adress :** **Email :**	Supplier Code : Supplier Bank Reference No. :	Order Date : Delivery Date :

No.	Goods / Service Description	Qty UoM	Unit Price	Amount .....

Terbilang / Amount in Word : .....

.....
Harga belum termasuk PPN / Price Excl. VAT

Order Pembelian yang sudah ditandatangani & disertai stempel asli agar dikirimkan ke alamat ..... ditujukan kepada .....
Signed & original stamped Purchase Order must be sent to PT Semen Indonesia (Persero) at ..... addressed to .....

Supplier	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Name : Position : Signature : (Sufficient Duty & signed — Stamp stamped)	Name : Position : Signature :

PERHATIAN / ATTENTION
Syarat dan ketentuan mengacu pada perjanjian Nomor / Terms and conditions refer to agreement Number.....

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:

LAMPIRAN II

Formulir Change Order

PT Semen Indonesia (Persero)Tbk

MEMO PERUBAHAN PURCHASE ORDER (PO)

NO :

No. PO/PR :

Tanggal PO :

Pekerjaan

Dari :

Perubahan yang di maksud :

☐ Spesifikasi ☐ JumlahYg di Minta ☐ Menjadi Prioritas / Biasa ☐ Perpanjangan Waktu

No Item	DATA PK SEMULA					DATA PERUBAHAN				
	Jml	Sat	Nama Jasa	Tanggal PO	Harga Satuan	Jml	Sat	Nama Jasa	Tanggal PO	Harga Satuan
JML			Total					Total		

PT Semen Indonesia (Persero)Tbk

PENJELASAN : PO tersebut di revisi sesuai dengan :	Tempat tanggal/bulan/tahun Pembuat (Nama)
Disetujui Oleh :	

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggung jawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diakses oleh AKHMAD BASTARI, ST. (192.168.124.142), Tanggal 14-03-2024

Catatan Dari:
